

[zurück Home weiter](#)

2.02.01 Projekt

Die Maske **Projekt** verwaltet die Projektstammdaten im System. Hier lässt sich die Projektstruktur, also die Gliederung in Projekte und Unterprojekte, definieren. Grundsätzlich kann jedes Projekt aus endlich vielen Unterprojekten und Hierarchiestufen bestehen.

In der Maske werden alle relevanten Informationen über das Projekt und seine Beziehung zum Oberprojekt (seine hierarchische Stellung also in der Projektstruktur), die Aktivität, Kunden, Währung, Projektstundensatz, Projektleiter, die nötigen Qualifikationen, die Zuordnung zum Projektteam, Kostenstelle und Anlagedaten definiert. Darüber hinaus werden hier die Planwerte für Projektbeginn und -ende, das Projektbudget, die Projektkosten und die Projektdauer dem Projektverantwortlichen angezeigt.

Anmerkung: Für die Projekte können (analog zu den Units) funktionale Berechtigungen definiert werden (siehe auch Administrationsleitfaden)!

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Stammblatt

Basisinformationen

Projekt-Nr. Status **aktiv**

Bezeichnung

Inhaltsbeschreibung

Plan-Beginn Plan-Ende

Bemerkung

Struktur

Hauptprojekt Oberprojekt

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Projektmanager	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
1 045.1	Planung	aktiv	18.09.2019	05.10.2019	008 Jansen Olivia	68:00	68:00	17:30
2 045.2	Anpassungen	aktiv	07.10.2019	12.11.2019	008 Jansen Olivia	152:00	152:00	08:45
3 045.3	Testbetrieb	aktiv	12.11.2019	10.01.2020	008 Jansen Olivia	32:00	32:00	00:00
						252:00	252:00	26:15

Basisinformationen

Struktur

Hauptprojekt: 045 Implementierung bei CS Oberprojekt: 045 Implementierung bei CS

Unterprojekte	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Projektmanager	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
							00:00	00:00	00:00

Vorgänge	Vorgangs-Nr.	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	ext.	Planaufwand	Sollaufwand	Istaufwand	abge
<input type="checkbox"/>	1	045.1-1 Installation Basissystem	18.09.2019	19.09.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04:00	04:00	03:30	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	045.1-2 Konzeptgespräche	19.09.2019	24.09.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	24:00	24:00	10:00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	045.1-3 Pflichtenheft erstellen	24.09.2019	01.10.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	40:00	40:00	04:00	<input type="checkbox"/>
						68:00	68:00	17:30	

Meilensteine	Meilenstein-Nr.	Bezeichnung	Datum	Verantwortlicher	Meilensteinkategorie	abge
<input type="checkbox"/>	1	045.1-A Abnahme Pflichtenheft	05.10.2019	002 Schaub Peter	Projekt-Meilenstein	<input type="checkbox"/>

• **Basisinformation:**

- **Projekt-Nr.:** Dieses alphabetische Feld kennzeichnet das Projekt eindeutig im System. Die Projektnummer kann jederzeit verändert werden; muss aber eindeutig im Datenbestand sein. Diese Nummer wird in der Regel mit einen Nummernkreis vorbelegt und wird auf alle projektbezogenen Elemente (Unterprojekte, [Arbeitspakete](#), [Meilensteine](#), ...) vererbt.
- **Status:** Dieses Feld kennzeichnet, ob das Projekt aktiv, passiv oder abgeschlossen ist. Bei Neuanlage eines Projektes wird dieses Feld vom System mit Passiv vorbelegt. Weitere Ausprägungen (unterbrochen, abgebrochen) können vom Administrator definiert werden.
- **Bezeichnung:** Dieses Feld bezeichnet das Projekt.
- **Inhaltsbeschreibung:** In diesem Feld kann eine zusammenfassende Inhaltsbeschreibung des Projektes hinterlegt werden.
- **Projektzeitraum (von/bis):** Das Feld Plan-Beginn definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld Plan-Ende definiert das voraussichtliche Projektende. Eine Eingabe für diese Felder ist zwingend erforderlich. Hierdurch wird die Basis für die [Auswertungen](#) (Gantt-Diagramm, Meilenstein-Trend-Analyse, ...) des Informationssystems gelegt.
- **Bemerkung:** Hier können weiterführende Kommentare zum Projekt eingetragen werden.

• **Struktur:**

- **Hauptprojekt:** Die oberste Organisationseinheit einer Projektstruktur. Es hat selbst kein darüberliegendes Projekt.
- **Oberprojekt:** Das Feld Oberprojekt charakterisiert die Existenz eines übergeordneten Projektes. Ist das Element nicht belegt, dann ist das Projekt selbst ein Oberprojekt. Die Projektstruktur wird mit Hilfe des [Projektstrukturplans](#) dargestellt. Beim Anlegen von Unterprojekten, wird dieser Eintrag automatisch gefüllt.
- **Unterprojekte:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Unterprojekte. Nach der Definition von Unterprojekten, werden diese automatisch im Oberprojekt als Unterprojekte übertragen.
- **Vorgänge:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten [Arbeitspakete](#) oder [Vorgänge](#).
- **Meilensteine:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten [Meilensteine](#).

Beteiligte

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | **Beteiligte** | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

ext. Beteiligte

ext. Auftrag: Kontakt: CS Consult Systeme AG

kaufm.: Nahl Lisa

Ansprechpartner

fachl. Ansprechpartner: Sander Peter

techn. Ansprechpartner: Lahr Ingo

Rechnungsempfänger

	Auftraggeber	Ansprechpartner	Anteil	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	1 CS Consult Systeme AG	Nahl Lisa	60,00 %	
<input type="checkbox"/>	2 AB Autobau AG	Rahn Olaf	40,00 %	
			100,00 %	
			100,00 %	
			100,00 %	

Endkunde: AB Autobau AG

interne Beteiligte

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | **Beteiligte** | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

ext. Beteiligte

interne Beteiligte

Unit: Abteilung A | Kostenstelle: Technik

Projektmanager

	Name	Vorname	Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/>	1 Jansen	Olivia	- 11	

Projektteam

	Vorname	Name	Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/>	1	*Java		
<input type="checkbox"/>	2 Katrin	Damler	- 10	k.damler@firma.de
<input type="checkbox"/>	3 Peter	Schaub	- 11	p.schaub@firma.de
<input type="checkbox"/>	4 Norbert	Schmidt	- 14	n.schmidt@firma.de

Lenkungsausschuss

	Vorname	Name	Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/>	1 Norbert	Schmidt	- 14	n.schmidt@firma.de

Projektpartner

	Kontakt	Ansprechpartner 1	Ansprechpartner 2	Mitarbeiter	Rolle	Bemerkung
<input type="checkbox"/>						

• **ext. Beteiligte:**

- **Externer Auftrag:** Dieses Feld kennzeichnet, ob das Projekt extern ist. Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewählten Projekt um ein externes Projekt, ansonsten um ein internes Projekt. Bei externen Projekten verlangt das System die Zuordnung eines Auftraggebers.
- **Kontakt:** In diesem Feld wird der Kontakt des Projektes eingetragen.
- **Kaufm./Fachl. /Techn. Ansprechpartner:** Das Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner für das Projekt. Dieses Feld wird nach Auswahl eines Kunden mit den Ansprechpartnern dieses Kunden gefüllt. Die Ansprechpartner werden in der Maske [Ansprechpartner](#) verwaltet.
- **Rechnungsempfänger:** Wenn die Projektrechnungen prozentual auf mehrere Auftraggeber aufgeteilt werden sollen, sind hier die einzelnen Empfänger mit einem

Prozentsatz hinterlegbar. Der Ablauf ist folgender: Zunächst wird eine normale Rechnung erstellt, diese wird dann mit der Aktion "Rechnung aufteilen" in mehrere Rechnungen umgewandelt und jeder Empfänger erhält eine Rechnung mit seinem prozentualen Anteil. Die Summe der einzelnen Rechnungen entspricht dann wieder dem Gesamtbetrag.

- **Endkunde:** Hier kann ein vom Auftraggeber abweichender Endkunde eingetragen werden
- **interne Beteiligte:**
 - **Unit:** In diesem Feld wird die verantwortliche Unit festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Die Leiter dieser Units haben für dieses Projekt dann dieselbe Berechtigung wie die Projektmanager. Units können in der Maske [Unit](#) bearbeitet werden.
 - **Projektmanager:** Dieses Feld kennzeichnet den Projektleiter des Projektes. Der Projektleiter wird automatisch auch Projektmanager aller definierten Unterprojekte. Somit ist gewährleistet, dass der Projektleiter die Berechtigung erhält, zu diesem Projekt Daten anzulegen und zu verändern. Im Normalfall erhält ein Mitarbeiter erst dann Zugriff auf ein Projekt, wenn er in das Projektteam aufgenommen wurde.
 - **Projektteam:** Diese Mehrfachauswahl ermöglicht die Zusammenstellung des Projektteams. Dabei werden die Projektleiter der Unterprojekte und die Bearbeiter der zugeordneten [Arbeitspakete](#) automatisch in das Projektteam übernommen.
 - **Lenkungsausschuss:** Hier können die Mitglieder des Lenkungsausschusses hinterlegt werden
 - **Projektpartner:** Hier können die internen und/oder externen Projektpartner und deren Rolle im Projekt eingegeben werden

Antrag

The screenshot shows the 'Antrag' (Request) tab in a project management software interface. The interface is titled 'Projekt 045 Implementierung bei CS'. The sidebar contains tabs for 'Stammblatt', 'Beteiligte', 'Antrag', 'Portfolio', 'Risikobewertung', 'Status', 'Kennzahlen', 'Budget', 'Auftrag & Finanzen', 'Dokumentation', 'Abschluss', and 'Sonstiges'. The main content area is divided into several sections:

- Hintergrund und derzeitige Situation:** A large empty text area.
- Ziele:** A large empty text area.
- Anforderungen:** A table with columns: Id, Status, Bezeichnung, Projekt, Referenz, Referenz Hauptproj, and Bemerkung. The table contains two rows, both with 'Offen' status and '045 Implementi...' in the 'Projekt' column.
- Einschränkungen:** A large empty text area.
- Innerhalb und außerhalb des Umfangs:** A large empty text area.
- Herangehensweise:** A large empty text area.

Diese Felder dieses Reiters dienen zur Beschreibung des Projektantrages

Portfolio

• Attribute:

- **Wahrscheinlichkeit:** Dieses Feld kennzeichnet bei passiven Projekten die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem geplanten Projekt ein aktives Projekt (=Auftrag) wird. Diese Wahrscheinlichkeit geht anteilig in die [Kapazitätsplanung](#) ein und wird im Vorschlagswesen verwendet. Wenn ein Projekt aktiviert wird, setzt das System diese Wahrscheinlichkeit automatisch auf 100%.
- **Priorität:** Dieses Feld kennzeichnet die Priorität des ausgewählten Projektes.
- **Auftragsart:** Dieses Element dient als Kennzeichen für die spätere Abrechnung des Projektes (Aufwand oder Festpreis). Dieses Feld wird auch bei einigen Versionen als Kennzeichen für die Bewertung von fertigen und unfertigen Leistungen verwendet.
- **Projektart:** Dieses Feld weist dem Projekt eine definierbare Projektart zu, die als Selektionskriterium bei den Auswertungen verwendet werden kann.
- **strateg. Relevanz:** Hier kann eine Bewertung des Projektes für die strategischen Relevanz für die Projektlandschaft hinterlegt werden
- **Klasse:** Hier kann hinterlegt werden, ob das Projekt gemacht werden muss/kann/soll

• Programm & Portfolio:

- **Programm, Portfolio:** Wenn das definierte Projekt einen Portfolio oder Programm zugeordnet ist, wird das entsprechende Element hier automatisch angezeigt oder es kann hier ausgewählt werden
- **Produkt:** Hier kann das Projekt einem Produkt zugeordnet werden (entweder als reiner Eintrag oder als Objekt Produkt aus dem Modul Produktmanagement)

Risikobewertung

Auf diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit eine grobe Risikoplanung für das Projekt durchzuführen.

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | **Risikobewertung** | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Bewertung

Summe der Risiken: 33

Kundenrisiken

Summe Kundenrisiken: 6

Der Kunde hat genügend KnowHow, das Projekt zu unterstützen: 2 | +

Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig: 3 | 0

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden: 1 | ++

wirtschaftliche Risiken

Summe wirtschaftliche Risiken: 9

Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab: 1 | ++

Das Projekt wird nach Aufwand angeboten: 2 | +

Das Projekt wird mit den Standardbedingungen angeboten: 4 | -

Die Aufwandsschätzung ist sehr sicher: 2 | +

Die dargestellte Risikobewertung ist ein Implementierungsbeispiel und weicht in vielen Version davon ab. Die Risiken werden kategorisiert (hier in Kundenrisiken, wirtschaftliche Risiken, Ressourcenrisiken und Durchführungsrisiken) und beinhalten oft Punktesysteme.

Status

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | **Status** | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Statusberichte

Projekt-: 27.10.2019 | Berichtsperiode: wöchentlich

Statusbericht

Statusberichte

	Berichtsdatum	nächstes Berichtsdatum	Erfasser	Status Gesamt	Status Termine	Status Kosten	Status Qualität	erw. Projektende
1	27.10.2019 15:25	04.11.2019 00:00	002 Schaub Peter	2 - Problematisch	2 - Problematisch	1 - Planmäßig	0 - Günstig	10.01.2020
+	27.10.2019 15:27		002 Schaub Peter	1 - Planmäßig	1 - Planmäßig	1 - Planmäßig	1 - Planmäßig	10.01.2020

Projektänderungsanträge

	Bezeichnung	Datum	Erfasser	Status	Änderungstyp	Priorität
1	Änderung 2	23.10.2019	002 Schaub Peter	Offen	Marktveränderung	3 - normale Priorität
2	Änderung 1	22.10.2019	002 Schaub Peter	Genehmigt	Anfrage vom Kunden	4 - hohe Priorität
+		27.10.2019	002 Schaub Peter	Erfasst		

Fertigstellungsgrade

Risiken

- **Statusberichte:** Die Statusberichte sind ein wichtiger Teil des Projektmanagements und des Projektcontrolling. In ihnen wird der Fortschritt des Projektplans dokumentiert. Der Statusbericht beinhaltet oft die Statusinformationen bzgl. Terminen, Kosten und Qualität (manchmal auch weitere), Begründungen, Fortschrittsinformationen (erwartetes Projektende, Restkosten, ...)

- **Projektänderungsanträge:** Eine Änderungsanforderung (Change Request) bezeichnet im Änderungsmanagement von Projekten einen formalisierten Wunsch nach Veränderung der Eigenschaften eines bestimmten Produktmerkmals. Der Änderungsantrag beinhaltet oft die Beteiligten/Verantwortlichen, die Priorität, eine Kategorisierung und die quantitativen Auswirkungen (Aufwand, Kosten, Umsatz, ...) auf das Projekt
- **Fertigstellungsgrade:** Hier können vom Projektleiter regelmäßig die Fertigstellungsgrade des Projektes eingegeben werden (beispielsweise für das Controlling oder die POC-Bewertung)
- **Risiken:** Hier werden (wenn das Modul Risikomanagement verfügbar ist) die Risiken angezeigt

Kennzahlen

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | **Kennzahlen** | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Aufwendungen

Sollaufwand	252:00	31,500 Pt	Planaufwand	252:00	31,500 Pt		
Istaufwand	26:15	3,281 Pt	fakturierbarer Aufwand	28:00	3,500 Pt	fakturiertes Aufwand	28:00 3,500 Pt
erw. Restaufwand	198:30	24,813 Pt	Letzte Zeitenprüfung		zum		

Kennzahlen

Angebotswert	52.464,16 EUR
Auftragswert	49.886,72 EUR
Rechnungswert	6.468,53 EUR

Angebote
 Aufträge
 Bestellungspositionen
 Rechnungen
 stornierte Rechnungen

- **Aufwendungen:**
 - **Sollaufwand:** Dieses Feld wird im Rahmen der Planung vom System bestimmt und definiert die voraussichtliche Projektdauer in Stunden bzw. Tagen. Während der Planung wird dieser Wert aktualisiert (analog zum Plan-Aufwand) und wenn die Planung abgeschlossen wird (Statusübergang auf "Vorleistung" oder "aktiv") wird dieser Wert nicht mehr verändert.
 - **Planaufwand:** Dieses Feld definiert die voraussichtliche Projektdauer. Dieses Feld wird entweder automatisch nach dem [ButtomUp-Prinzip](#) bestimmt oder im Rahmen der [TopDown-Planung](#) vom Benutzer vorgegeben. Dieser Wert ist bis zum Statusübergang auf "Vorleistung" oder "aktiv" identisch mit den Soll-Aufwand.
 - **Istaufwand:** Diese Feld beinhaltet die erfassten Zeiten für das zugeordnete Projekt. Diese Istaufwände werden bei jeder Änderung in der Erfassungskomponente [TimeTracker](#) in die Projekte und [Arbeitspakete](#) übertragen.
 - **fakturierbarer Aufwand:** Diese Feld beinhaltet die fakturierbaren Aufwände für das zugeordnete Projekt.
 - **fakturiertes Aufwand:** Diese Feld beinhaltet die abgerechneten Zeiten für das zugeordnete Projekt. Diese fakturierten Zeiten werden bei jeder Rechnungsstellung oder Stornierung in die Projekte und [Arbeitspakete](#) übertragen.
 - **erw. Restaufwand:** Dieses Feld zweigt die letzte erfasste Restaufwandschätzung

abzüglich der danach erfassten Aufwände an

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Angebote

Angebots-Nr.	Status	Netto	Brutto	gültig bis
1 CS-19-09-4	Angebot storniert	54.464,16 EUR	64.812,35 EUR	25.09.2019
2 CS-19-09-5	Angebot fertig...	52.464,16 EUR	62.432,35 EUR	25.09.2019

Aufträge

Auftrags-Nr.	Status	Netto	Brutto	Bestelldatum	Bestell-Nr.
1 CS-19-09-5	Auftrag fertige...	49.886,72 EUR	59.365,20 EUR	11.09.2019	324324

Bestellungspositionen

Rechnungen

Erfasser	Status	von	bis	Nettobetrag
1 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.09.2019	11.09.2019	5.508,53 EUR
2 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.10.2019	15.10.2019	960,00 EUR

Hier werden die Fakturadokumente (Angebote, Aufträge, Ausgangsrechnungen, ...) des Projektes aufgelistet.

Budget

Projekt 045 Implementierung bei CS

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

	Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
int. Personalkosten	33.454,40 EUR	15.540,00 EUR	17.914,40 EUR	53,55 %
ext. Personalkosten	1.920,00 EUR	1.200,00 EUR	720,00 EUR	37,50 %
Summe Personalkosten	35.374,40 EUR	16.740,00 EUR	18.634,40 EUR	52,68 %

sonst. Budgets

Bezeichnung	Kostenart	int. Budget	Zuschlag	ext. Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
1 Externen Programmierer	Fremdleistungen...	2.000,00 EUR	25 %	2.500,00 EUR	500,00 EUR		
2 Reisen Hamburg	Reisekosten Proj...	2.000,00 EUR		2.000,00 EUR	0,00 EUR		
3 Projectile Basisversion (Version 5) ...	Lizenzen	4.500,00 EUR		6.900,00 EUR	2.400,00 EUR	1	Projectile Basisversion BV
4 Projectile Fakturamodul	Lizenzen	1.850,00 EUR		2.900,00 EUR	1.050,00 EUR	1	Fakturamodul FM
5 Projectile ReportMaker	Lizenzen	1.850,00 EUR		2.900,00 EUR	1.050,00 EUR	1	ReportMaker FM
		12.200,00 EUR		17.200,00 EUR	5.000,00 EUR		

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen **Budget** Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

sonst. Budgets

Vorkalkulation

Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
52.574,40 EUR	28.940,00 EUR	23.634,40 EUR	44,95 %

Zuschläge (optional)

	Prozentual	Absolut
Festpreiszuschlag	0,00 %	0,00 EUR
Risikozuschlag	3,00 %	1.577,23 EUR
Verhandlungszuschlag	4,00 %	2.102,98 EUR

Gesamtkalkulation

Umsatz	Profit monetär	Profit in %
56.254,61 EUR	27.314,61 EUR	48,56 %

Auf dem Reiter „Budget“ befinden sich im oberen Rahmen die Planumsätze, Plankosten und der geplante Profit (absolut und in Prozent). Diese Werte berechnen sich auf Basis der Arbeitspakete. Im nächsten Rahmen können sonstige Budgets verwaltet werden, bspw. für Reisekosten, externe Berater und Lizenzgebühren. Im unteren Rahmen befinden sich die Zuschläge. In den meisten Versionen können bis zu drei Zuschläge (absolut oder prozentual) eingegeben werden. In der Standardversion sind das Zuschläge für Festpreisprojekte, Risiken (meist in der Aufwandsschätzung) und Verhandlungszuschläge.

Berechnungsformeln:

Vorkalkulation Umsatz = Summe aller Job-Zeiten * externer Stundensatz + Summe aller Budgets (externer Betrag)

Vorkalkulation Kosten = Summe aller Job-Zeiten * interner Stundensatz + Summe aller Budgets (interne Beträge)

Festpreiszuschlag = (Vorkalkulation Umsatz * prozentualer Festpreiszuschlag / 100) oder absoluter Festpreiszuschlag

Risikozuschlag = (Vorkalkulation Umsatz * prozentualer Risikozuschlag / 100) oder absoluter Risikozuschlag

Verhandlungszuschlag = (Vorkalkulation Umsatz * prozentualer Verhandlungszuschlag / 100) oder absoluter Verhandlungszuschlag

Gesamtkalkulation Umsatz = Vorkalkulation Umsatz + Festpreiszuschlag + Risikozuschlag + Verhandlungszuschlag - absoluter Rabatt

Gesamtkalkulation Profit monetär = Gesamtkalkulation Umsatz - Vorkalkulation Kosten

Gesamtkalkulation Profit in % = Gesamtkalkulation Profit monetär / Gesamtkalkulation Umsatz * 100

Auftrag & Finanzen

Projekt 045 Implementierung bei CS

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Auftragsdaten

Bestell-Nr.

Bestelldatum Bestellwert EUR

Auftragseingang

Rabatt % Skonto %

Reisekostenregelung

RK-Abrechnungsart Pauschale pro Tag

RK-Pauschalpreis EUR

RK- 200,00 EUR

Tagespauschale

Währung und Sätze

Währung EURO Kurs 1

ext. Stundensatz EUR ext. Stundensätze

• Auftragsdaten:

- **Bestell-Nr., Bestelldatum:** Hier kann die Bestellnummer und das Bestelldatum des Projektes eingegeben werden. Diese Bestelldaten können für den Rechnungsausdruck verwendet werden. Die Bestellnummer und das Bestelldatum werden vom System automatisch übertragen, wenn eine [Auftragsbestätigung](#) definiert übernommen wird.
- **Bestellwert:** Dieses Feld kann zur Definition des Festpreises (maximale Obergrenze aller Rechnungen für dieses Projekt) herangezogen werden. Wird dieser Bestellwert hier definiert, so stellt der automatisch bestimmte Wert Plan-Umsätze nur das theoretische Projektbudget, auf Basis der Plan-Werte aus den [Arbeitspaketen](#) und der [Budgetverwaltung](#), dar. Der Bestellwert wird vom System automatisch übertragen, wenn eine [Auftragsbestätigung](#) definiert übernommen wird.
- **Auftragseingang:** Hier kann die Auftragseingangsart (Fax, Brief, E-Mail, ...) eingetragen werden.
- **Rabatt:** Hier kann vermerkt werden, ob der Kunde einen Nachlass erhält.
- **Skonto:** In diesem Feld wird vermerkt, ob der Kunde einen Preisnachlass erhält, wenn er den Betrag sofort bezahlt.

• Reisekostenregelung:

- **RK-Abrechnungsart, RK-Pauschalpreis** und **RK-Tagespauschale:** Hier können die Vorbelegungen für die Abrechnung der Reisen des Projektes hinterlegt werden (keine Abrechnung, Pauschal, nach Aufwand). Diese Vorbelegung kann pro Reise abgeändert werden.


• Währung und Sätze:

- **Währung:** Das Feld Währung kennzeichnet die Projektwährung. Die Projektwährung überschreibt die generelle Systemwährung (siehe auch [Konfiguration](#)) und die Kundenwährung (siehe auch [Kunde](#)). Standardmäßig wird dieses Feld mit der Währung aus der Maske [Konfiguration](#) vorbelegt. Nach Auswahl eines Kunden wird ggf. die Hauswährung aus der Konfiguration durch die Kundenwährung geändert. Die Währungen können in der Maske [Währung](#) definiert und geändert werden.
- **Kurs:** Das Feld Kurs wird nach Auswahl einer Projektwährung automatisch mit dem

gültigen Umrechnungskurs der Projektwährung zur Hauswährung (siehe auch [Konfiguration](#)) vorbelegt. Hier kann nach der Vorbelegung auch ein abweichender Projektkurs (beispielsweise für internationale Projekte, bei denen das Währungsrisiko minimiert werden soll) definiert werden. Dieser Kurs ist auch bindend bei der Angebots- und Rechnungsstellung. Die Kurse werden in der Maske [Kurs](#) verwaltet.

- o **Externer Stundensatz (fix und variabel):** Diese Felder kennzeichnen den generellen Stundensatz (fix oder variabel) für die Weiterberechnung für das definierte Projekt. Ist dieses Feld gefüllt (und das entsprechende Feld im Arbeitspaket nicht), werden sämtliche Arbeitsleistungen mit diesem Satz verrechnet und das System berücksichtigt nicht mehr die Sätze aus den Masken [Kunden](#), [Mitarbeiter](#) oder [Tätigkeiten](#) (siehe auch [Preisfindung](#)). Der variable Satz ist dabei höherwertiger als der fixe Stundensatz.

Dokumentation

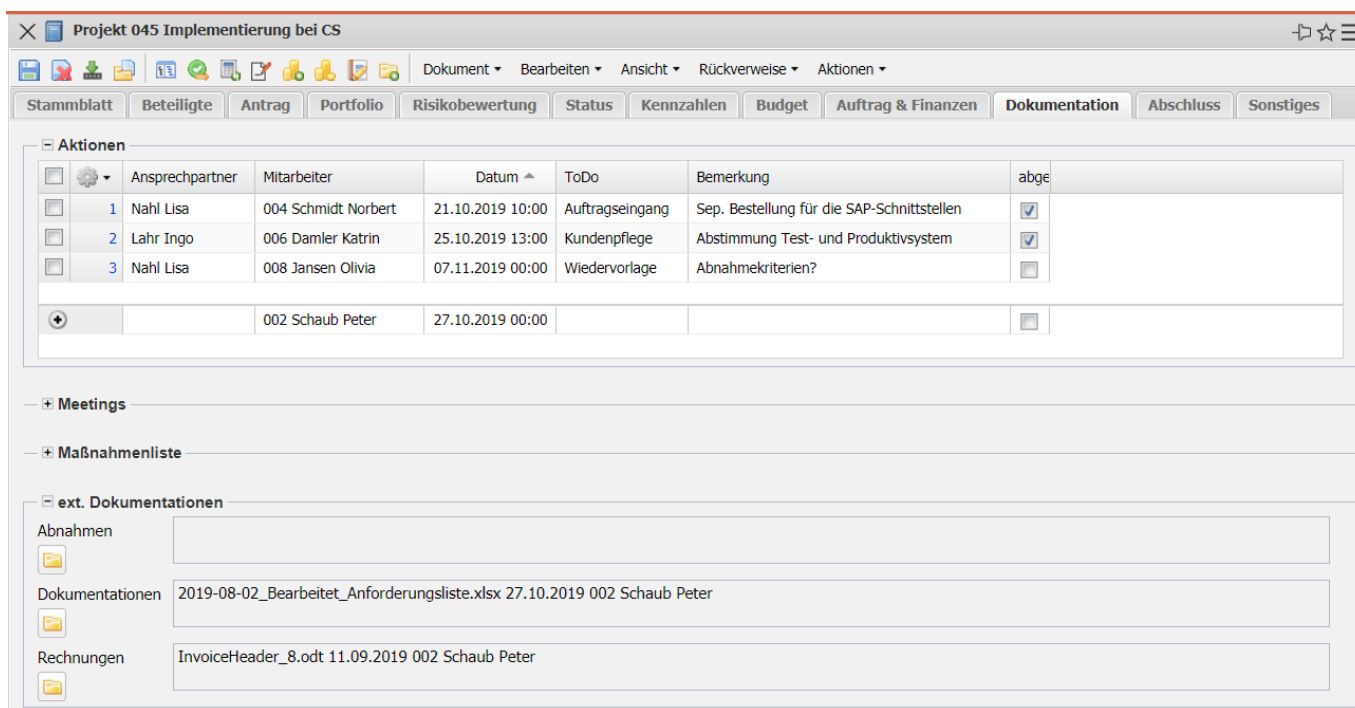

- **Aktionen:** In diesem Feld können Projektaktionen eingeben oder zugeordnet werden.
- **Meetings:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe oder Zuordnung von Meetings.
- **Maßnahmenliste:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Maßnahmen.
- **ext. Dokumentation:** Falls der Flyer verfügbar ist, können hier externe Dateien zugeordnet werden

Abschluss

- **Ersteller & Zusammenfassung:** Hier kann eine Zusammenfassung des Abschlussberichtes (Project Closing Document - PCD) hinterlegt werden.
- **Beschreibung der einzelnen Punkte:** Hier können detaillierte Informationen für den PCD eingegeben werden.
- **Lessons Learned:** Hier können Lessons Learned eingetragen werden, die auch von Benutzern ohne Zugriff auf das Projekt eingesehen werden können.

Sonstiges

- **technische Einstellungen & Details:**
 - **int. Schlüssel:** Dieses numerische Feld kennzeichnet das Projekt eindeutig. Diese Nummer wird vom System vorgeschlagen.
 - **Angebotswert:** Hier ist die Summe aller Angebotswerte des Projektes hinterlegt (netto).
 - **Rechnungswert:** Hier ist die Summe aller Rechnungswerte des Projektes hinterlegt (netto).
- **Kennzeichen für Erfassung und Reporting:**
 - **Betriebsfähigkeit:** Dieses Kennzeichen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete

des Projektes. Es ist ein Auswertungskriterium bei den Kapazitätsauswertungen und wird beispielsweise für interne Projekte oder Dauerprojekte verwendet, um diese Projekte bei der Auslastung der Mitarbeiter nicht zu berücksichtigen.

- **Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichen steuert die Eigenschaften der Vorgänge des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf den Vorgang (oder die Summe der zugeordneten Arbeitspakete) nur erfasst werden, solange der Planaufwand nicht überschritten ist.
 - **Arbeitspakete nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, solange der Planaufwand nicht überschritten ist.
 - **Zeiterfassung nur nach Planbeginn:** Dieses Kennzeichen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, wenn der Planbeginn des Arbeitspaketes erreicht ist.
 - **Zeiterfassung nur vor Planende:** Dieses Kennzeichen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, solange das Planende des Arbeitspaketes nicht erreicht ist.
 - **Projekt nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [TimeTracker](#) auf das Arbeitspakete des Projektes nur erfasst werden, solange der Planaufwand des Projektes nicht überschritten ist.
- **Prüfkennzeichen:**
 - **geprüft am, geprüft zum Stichtag:** In diesen Feldern kann das Prüfungsdatum des Projektes und der Stichtag der Prüfung eingetragen werden.
 - **letzte Statusänderung zu passiv, aktiv oder abgeschlossen:** Hier werden die wichtigsten Statusänderungen aufgelistet (passiv - erfasst, aktiv/Vorleistung, abgeschlossen/abgebrochen). Die vollständige Historie aller Statuswechsel befindet sich in im Menüpunkt „Ansicht - Ereignis-Log anzeigen“.

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt

Last update: **2021/02/05 13:12**

