


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt:

Stammblatt

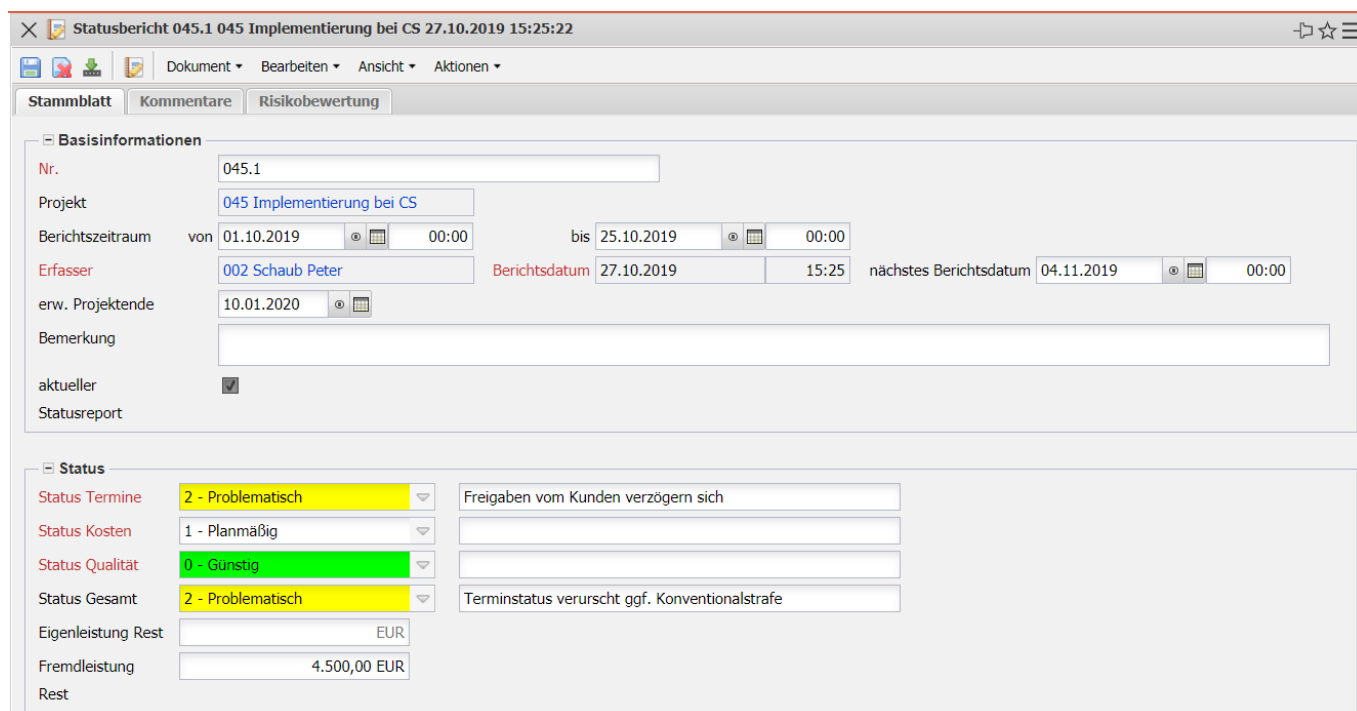

Basisinformationen

Nr. 045.1

Projekt 045 Implementierung bei CS

Berichtszeitraum von 01.10.2019 00:00 bis 25.10.2019 00:00

Erfasser 002 Schaub Peter Berichtsdatum 27.10.2019 15:25 nächstes Berichtsdatum 04.11.2019 00:00

erw. Projektende 10.01.2020

Bemerkung

aktueller Statusreport ☒

Status

Status Termine 2 - Problematisch Freigaben vom Kunden verzögern sich

Status Kosten 1 - Planmäßig

Status Qualität 0 - Günstig


Status Gesamt 2 - Problematisch Terminstatus verursacht ggf. Konventionalstrafe

Eigenleistung Rest EUR

Fremdleistung 4.500,00 EUR

Rest

• Basisinformationen:

- **Nr.:** In diesem Feld wird die Nummer des Statusberichts automatisch von System vergeben.
- **Projekt:** In diesem Feld wird das Projekt, das am Anfang des angelegten Statusberichts ausgewählt wurde, angezeigt.
- **Berichtszeitraum:** In diesem Feld wird der Zeitraum des Berichtes eingegeben.
- **Erfasser:** In diesem Feld wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Statusbericht angelegt hat.
- **Berichtsdatum:** An dieser Stelle wird angezeigt, wann dieser Bericht erstellt wurde.
- **nächstes Berichtsdatum:** In diesem Feld kann das Datum für den nächsten Bericht eingetragen werden.
- **erw. Projektende:** In dieser Auswahlbox wird ein Termin festgelegt, an dem das Projekt fertiggestellt werden soll.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Bemerkung zu dem geöffneten Statusbericht.
- **aktueller Statusreport:** 

• Status:

- **Status der Termine, Kosten und Qualität:** In diesen Auswahlfeldern kann der Status der Termine, Kosten und der Qualität festgelegt werden. Zur Auswahl stehen Günstig, Planmäßig, Problematisch und Kritisch.

- **Eigenleistung Rest, Fremdleistung Rest:** In diesen Felder können geschätzte Restwerte in EUR hinterlegt werden bzgl. Eigen- und Fremdleistung.

Kommentare

✕ 🔍 ☆ ☰

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammblatt **Kommentare** Risikobewertung

positiv

negativ

Risiken ☐

	Name	Bezeichnung	Risikotyp	Gruppe	Risikomanager	
<input type="checkbox"/>	1	Terminrisiko	Termine werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	004 Schmidt Norbert
<input type="checkbox"/>	2	Kostenrisiko	Kosten werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	002 Schaub Peter

Projekt-CR's ☐

	Bezeichnung	Status	Erfasser	Datum	Änderungstyp	Priorität	
<input type="checkbox"/>	1	Änderung 1	Genehmigt	002 Schaub Peter	22.10.2019	Anfrage vom Kunden	4 - hohe Priorität
<input type="checkbox"/>	2	Änderung 2	Offen	002 Schaub Peter	23.10.2019	Marktveränderung	3 - normale Priorität

- **positiv/negativ:** Diese Felder ermöglichen die Eingabe von positiven oder negativen Anmerkungen zu dem angelegten Statusbericht.
- **Risiken:** In diesen Textfelder kann der Projektleiter kritische Faktoren oder Risiken hinterlegen, welche im Projekt auftreten könnten oder schon aufgetreten sind.
- **Projekt-CRs:** Hier können in Textform dem Projekt zugehörige Änderungsanträge hinterlegt werden.

Risikobewertung

Statusbericht 045.1 045 Implementierung bei CS 27.10.2019 15:25:22

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Kommentare **Risikobewertung**

Bewertung

Summe der Risiken 21

Kundenrisiken

Summe Kundenrisiken 7

Der Kunde hat genügend KnowHow, das Projekt zu unterstützen 3 | 0

Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig 2 | +

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden 2 | +

wirtschaftliche Risiken

Summe wirtschaftliche Risiken 7

Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab 2 | +

Das Projekt wird nach Aufwand angeboten 2 | +

Das Projekt wird mit den Standardbedingungen angeboten 1 | ++





Die Aufwandsschätzung ist sehr sicher 2 | +

Ressourcenrisiken

- **Bewertung:**

- **Summe der Risiken:** 

- **Kundenrisiken:**

- **Summe Kundenrisiken:** 
- **Der Kunde hat genügend Know-How das Projekt zu unterstützen:** 
- **Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig:** 
- **Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden:** 







- **wirtschaftliche Risiken:**

- **Summe wirtschaftlicher Risiken:** 
- **Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab:** 
- **Das Projekt wird nach Aufwand angeboten:** 
- **Das Projekt wird nach Standardbedingungen angeboten:** 

- **Ressourcenrisiken:**

- **Summe Ressourcenrisiken:** 
- **Die Projektaufgabe ist von uns schon mehrfach erfolgreich gelöst worden:** 
- **Das Projektteam steht vollständig zur Verfügung:** 

- **Durchführungsrisiken:**

- **Summe Durchführungsrisiken:** 
- **Die Projektaufgabe ist sehr einfach:** 
- **Die Zeit für das Projekt ist gut bemessen:** 
- **Die Mitwirkungspflichten des Kunden sind gut geplant:** 
- **Der Projektleiter hat Erfahrung im Projektmanagement:** 
- **Die Aufgaben- & Leistungsbeschreibung sind eindeutig definiert:** 

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht&rev=1573222487



Last update: **2019/11/08 15:14**
