

Projektschablone

(3/6) Vervollständigen der Projekteckwerte:
Zurück Weiter Überprüfen
Verschiebung Vorwärts

[, Fehler Plan-Beginn: Schablone setzt Beginn auf 05.11.2019 19:22:13 aufgrund von Reisen Hamburg]

Oberprojekt

int. Schlüssel 55

Projektinfo Nummer 055

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Projektzeitraum von 18.11.2019 bis 27.03.2020

ext. Auftrag

kaufm. Ansprechpartner Nahl Lisa

Unit Abteilung A

Projektmanager

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Schaub	Peter	Festangestellt

Auftragsart Aufwand

Priorität 4 - hohe Priorität

Projektschablone

(5/6) Optionen Vorschlagswesen

Zurück

- mit Kapazitäten und Vorbelegung
- mit Kapazitäten**
- ohne Kapazitäten
- alle Mitarbeiter

Warnung

Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen:

00000 Projekt 'Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche' Plan-Ende: 27.03.2020 -> 30.03.2020

00006 Arbeitspaket 'Spezifikation' Plan-Beginn: 23.11.2019 -> 25.11.2019

00006 Arbeitspaket 'Spezifikation' Plan-Ende: 12.12.2019 -> 16.12.2019

00008 Projekt 'Umsetzungsphase' Plan-Beginn: 06.01.2020 -> 07.01.2020

00008 Projekt 'Umsetzungsphase' Plan-Ende: 27.03.2020 -> 30.03.2020

00009 Arbeitspaket 'Design' Plan-Beginn: 06.01.2020 -> 07.01.2020

00009 Arbeitspaket 'Design' Plan-Ende: 20.01.2020 -> 21.01.2020

00010 Arbeitspaket 'Mockup' Plan-Ende: 01.02.2020 -> 03.02.2020

00011 Arbeitspaket 'Entwicklung' Plan-Beginn: 02.02.2020 -> 03.02.2020

00011 Arbeitspaket 'Entwicklung' Plan-Ende: 20.03.2020 -> 23.03.2020

00012 Arbeitspaket 'Testen' Plan-Beginn: 21.03.2020 -> 23.03.2020

00012 Arbeitspaket 'Testen' Plan-Ende: 27.03.2020 -> 30.03.2020

00013 Arbeitspaket 'Dokumentation' Plan-Beginn: 21.03.2020 -> 23.03.2020

00013 Arbeitspaket 'Dokumentation' Plan-Ende: 23.03.2020 -> 25.03.2020

Ok

Projektschablone

1 - 5 6 - 7 Alle

(6/6) Vervollständigung der Projektplanung

Zurück Projekt erzeugen Neu Berechnen

☐ Automatische Vorwärtsberechnung nach Erzeugung

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Planaufwand	Zeit aufteilen	Tätigkeit	Unterprojekt	Planbeginn	Planende
Anforderungskatalog	<input type="text"/> Personal-Nr. <input type="text"/> Name	16:00 2,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Beratung	Planungsphase	18.11.2019	21.11.2019
Spezifikation	<input type="text"/> Personal-Nr. <input type="text"/> Name	40:00 5,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Beratung	Planungsphase	25.11.2019	16.12.2019
Design	<input type="text"/> Personal-Nr. <input type="text"/> Name	24:00 3,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	07.01.2020	21.01.2020
Mockup	<input type="text"/> Personal-Nr. <input type="text"/> Name	00:00 5,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	22.01.2020	03.02.2020
Entwicklung	<input type="text"/> Personal-Nr. <input type="text"/> Name	30:00 15,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	03.02.2020	23.03.2020

Name	Vorname	wahrsch. Ausl.	Auslastung
Schaub	Peter	174.2%	99.9%
Abel	Susanne	165.3%	165.3%
Damler	Katrin	154.5%	154.5%
Schneider	Maria	0.0%	0.0%

Projektschablone

1 - 5 6 - 7 Alle

(6/6) Vervollständigung der Projektplanung

Zurück **Projekt erzeugen** Neu Berechnen

☐ Automatische Vorwärtsberechnung nach Erzeugung

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Planaufwand	Zeit aufteilen	Tätigkeit	Unterprojekt	Planbeginn	Planende
Anforderungskatalog	<div><div><div>Name</div><div>Vorname</div></div><div><div>1</div><div>Schmidt</div><div>Norbert</div></div></div>	16:00 2,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Beratung	Planungsphase	18.11.2019	21.11.2019
Spezifikation	<div><div><div>Name</div><div>Vorname</div></div><div><div>1</div><div>Schmidt</div><div>Norbert</div></div></div>	40:00 5,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Beratung	Planungsphase	25.11.2019	16.12.2019
Design	<div><div><div>Name</div><div>Vorname</div></div><div><div>1</div><div>Schneider</div><div>Maria</div></div></div>	24:00 3,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	07.01.2020	21.01.2020
Mockup	<div><div><div>Name</div><div>Vorname</div></div><div><div>1</div><div>Damler</div><div>Katrin</div></div></div>	40:00 5,000 Pt	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	22.01.2020	03.02.2020
Entwicklung	<div><div><div>Name</div><div>Vorname</div></div><div><div>1</div><div>Abel</div><div>Susanne</div></div><div><div>2</div><div>Schneider</div><div>Maria</div></div></div>	96:00 12	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	03.02.2020	23.03.2020

Projekt 055 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument - Bearbeiten - Ansicht - Rückverweise - Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 055 Status passiv

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung


Plan-Beginn 18.11.2019 Plan-Ende 30.03.2020

Bemerkung

Struktur

Hauptprojekt 055 Entwicklung einer neuen Benutz Oberprojekt

Unterprojekte	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
1	055.1	Planungsphase	passiv	18.11.2019	16.12.2019	56:00	56:00	00:00
2	055.2	Umsetzungsphase	passiv	07.01.2020	30.03.2020	208:00	208:00	00:00
						264:00	264:00	00:00

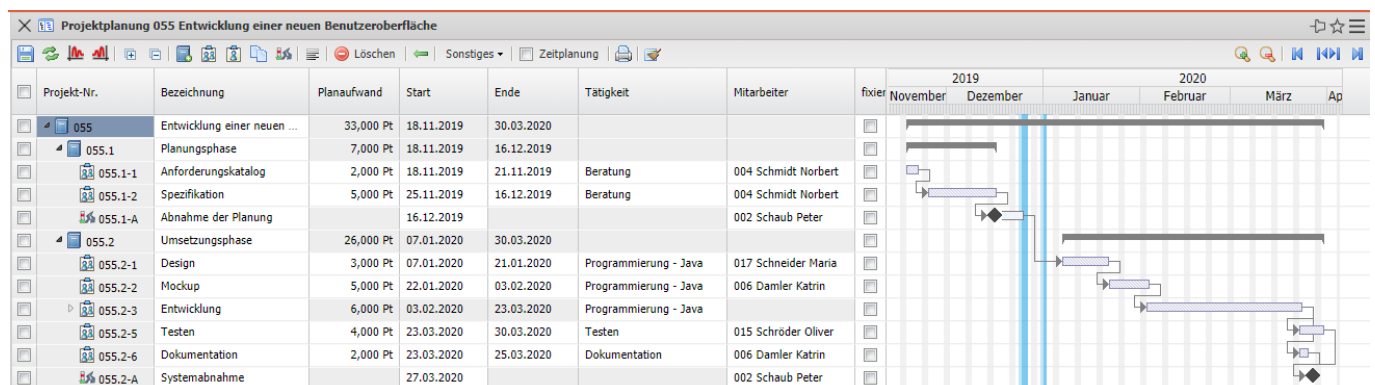

...Fortsetzung

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.06_reportgenerator_reportmaker



Last update: **2019/11/07 13:36**
