

[zurück Home weiter](#)

3.12.07 Mitarbeiterauswertung

Die Mitarbeiterauswertung beinhaltet die mitarbeiterbezogenen Auswertungen und Übersichten bezüglich Auslastung und Kapazitäten. Dazu gehören allgemeine Übersichten, Zeit- und Tätigkeitsnachweise, Plan/Ist-Vergleich, Auslastungs- und Kapazitätsauswertungen und Übersichten über Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, ...).

Hier können folgende Auswertungen generiert werden:

- [Mitarbeiterübersicht](#)
- [Zeitnachweise](#)
- [Tätigkeitsnachweis](#)
- [Stundenzettel](#)
- [Projektzeit Extern/Intern](#)
- An-/Abwesenheitsübersichten (Dokumentation folgt)
- [Mitarbeiter Plan/Ist](#)

und die Kapazitätsauswertungen (in Abschnitt [3.12.04_kapazitaetsauswertung](#) beschrieben)::

- [Auslastungsübersicht I](#), [Auslastungsübersicht II](#) und [Auslastungsübersicht III](#)
- [Kapazitätenauswertungen I](#), [Kapazitätenauswertungen II](#) und [Kapazitätenauswertungen III](#)
- [Kalenderübersicht I](#) und [Kalenderübersicht II](#)

Mitarbeiterübersicht

Die Auswertung **Mitarbeiterübersicht** liefert eine Übersicht über die Zuordnung von Mitarbeiter, Projekt und Tätigkeit. Hier werden Informationen zur Verfügung gestellt, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt für welches Projekt tätig ist. Diese Auswertung basiert ausschließlich auf den Plandaten (auch Start und Ende) der [Arbeitspakete](#).




Eine entsprechende Auswertung auf Basis der Istdaten im System liefert die Auswertung [Zeitnachweise](#).

Mitarbeiterübersicht							
Mitarbeiter	Kunde	Projekt	Arbeitspaket	Tätigkeit	Kostenstelle	Beginn Arbeitspaket	Ende Arbeitspaket
Batzeck Klaus							
	CONSULT GmbH	CS07 Einführung Projectile	CS07-1 Projektleitung	Projektleitung	20 - Geschäftsführung	19.06.2006	09.08.2006
Müller Julia							
		MSP.4 Entwicklung	MSP.4-2 Festlegen mehrstufiger Entwurf	Allgemeine Tätigkeit	30 - Verwaltung	01.03.2006	11.09.2006
		MSP.4 Entwicklung	MSP.4-3 Zuordnen von Entwicklungspersonal	Allgemeine Tätigkeit	30 - Verwaltung	01.03.2006	11.09.2006
Schröder Sandra							
		MSP.2 Analyse/Softwareanforderungen	MSP.2-1 Ausführen der Bedarfsanalyse	Allgemeine Tätigkeit	40 - Entwicklung	01.03.2006	11.09.2006
		MSP.2 Analyse/Softwareanforderungen	MSP.2-2 Erstellen des Softwarepflichtenheftes	Allgemeine Tätigkeit	40 - Entwicklung	01.03.2006	11.09.2006
		MSP.2 Analyse/Softwareanforderungen	MSP.2-3 Überprüfen des Softwarepflichtenheftes/Budgets mit dem Team	Allgemeine Tätigkeit	40 - Entwicklung	01.03.2006	11.09.2006
		MSP.3 Entwurf	MSP.3-2 Ausarbeiten der Funktionsbeschreibungen	Allgemeine Tätigkeit	40 - Entwicklung	01.03.2006	11.09.2006
	CONSULT GmbH	CS07.3 Einführung	CS07.3-2 Schulung	Schulung	40 - Entwicklung	03.08.2006	08.08.2006
	Vattenfall Europe	25.3 Customizing	25.3-1 Einarbeitung Konfiguration und Berechtigung	Allgemeine Tätigkeit	40 - Entwicklung	25.09.2006	29.09.2006

Zeitnachweise

Die Auswertung **Zeitnachweise** liefert eine Übersicht über die Projektleistungen der Mitarbeiter und die Auflistung der einzelnen Tätigkeiten mit den Bemerkungen aus der Zeiterfassung. Diese Auswertung generiert eine Übersicht über die Summen- und Einzelzeitnachweise eines Mitarbeiters basierend auf der Erfassung im **TimeTracker** für die **Arbeitspakete** der Mitarbeiter. Die Auswertung wird in der Regel für interne Nachweis für das Controlling oder als externer Nachweis als Anlage zur Rechnungsstellung verwendet.

Eine entsprechende Auswertung auf Basis der Plandaten im System liefert die Auswertung **Mitarbeiterübersicht**.

   Dateien							
Zeitrachweise							
Summennachweis							
Topprojekt	Vorgang	Mitarbeiter	Plan-Begin	Plan-Ende	Ist-Aufwand [h]	Plan-Aufwand [h]	Ist-Ende
EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	1: Schaub Peter	09.02.2004	05.03.2004	37,00	0,00	08.03.2004
EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	1: Schaub Peter	09.02.2004	11.02.2004	20,00	24,00	11.02.2004
EP Implementation Projectile	EP.2-3 Testen	1: Schaub Peter	26.02.2004	01.03.2004	11,50	8,00	01.03.2004
EP Implementation Projectile	EP.3-1 Installation	1: Schaub Peter	02.03.2004	03.03.2004	8,00	8,00	03.03.2004
					76,50	40,00	
Einzelnachweis							
Datum	Dauer	Periode	Arbeitspaket	Tätigkeit	Mitarbeiter	Bemerkung	
09.02.2004	3,00	08:00-11:00	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern	
09.02.2004	4,00	13:00-17:00	EP.1-1 Konzeptgespräche	Beratung	Schaub Peter	Detailierung Anforderungskatalog	
10.02.2004	2,00	08:00-10:00	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Projektmeeting Intern	
10.02.2004	7,00	13:00-20:00	EP.1-1 Konzeptgespräche	Beratung	Schaub Peter	Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle	
11.02.2004	9,00	08:00-12:00,13:00-18:00	EP.1-1 Konzeptgespräche	Beratung	Schaub Peter	Schnittstellen Einführung, speziell Schulungen	
12.02.2004	8,50	08:00-13:00,13:30-17:00	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Koordination und Statusmeeting Vorbereitung Pflichtenheft	
13.02.2004	4,00	08:00-12:00	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Kordination, Berichtswesen	
17.02.2004	3,00	08:00-11:00	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Mitarbeitereinsatzplanung; Abstimmung Kunde	
23.02.2004	8,50	08:00-16:30	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Status-Meeting, Präsentation Kunde	
27.02.2004	4,00	08:00-12:00	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Projektplan überarbeitet, Präsentation vorbereitet	
27.02.2004	3,50	14:00-17:30	EP.2-3 Testen	Qualitätssicherung	Schaub Peter	Fibu-Schnittstelle	
01.03.2004	8,00	08:00-16:00	EP.2-3 Testen	Qualitätssicherung	Schaub Peter	Integrationstest	
02.03.2004	4,00	08:00-12:00	EP-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Abstimmung Prototyp	
03.03.2004	8,00	08:00-16:00	EP.3-1 Installation	Installation	Schaub Peter		
	76,50						

Tätigkeitsnachweis

Die Auswertung **Tätigkeitsnachweis** liefert eine Übersicht über die Projektleistungen und Arbeitszeiten der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitintervall. Die Projektleistungen basieren auf den Erfassungsdaten im **TimeTracker** für die **Arbeitspakete** der Mitarbeiter. Die Arbeitszeitdaten werden im **TimeTracker** als "Kommen-Gehen" eingegeben oder können mit Hilfe einer Option als Summe der Projektzeiten automatisch vom System bestimmt werden. Die Abwesenheiten (Urlaub, Krank, Mutterschutz, ...) können dezentral im **TimeTracker** oder zentral in der **Abwesenheitserfassung** definiert werden.

Tätigkeitsnachweis										
Mitarbeiter Schaub Peter										
Datum	Zeiten	Projekt	Arbeitspaket	Projektzeit[h]	Projektzeit[Pt]	Plan-Arbeitszeit[h]	Arbeitszeit[h]	Differenz[h]	Arbeitszeit[Pt]	Differenz[Pt]
02.02.2004			Urlaub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2004			Urlaub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2004			Urlaub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2004			Urlaub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2004			Urlaub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2004	08:00-11:00	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	3,00	0,38		3,00		0,38	
	13:00-17:00	EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	4,00	0,50	0,00	4,00	7,00	0,50	0,88
10.02.2004	08:00-10:00	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	2,00	0,25		2,00		0,25	
	13:00-20:00	EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	7,00	0,88	0,00	7,00	9,00	0,88	1,12
11.02.2004	08:00-12:00,13:00-18:00	EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	9,00	1,12	0,00	9,00	9,00	1,12	1,12
12.02.2004	08:00-13:00,13:30-17:00	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	8,50	1,06	0,00	8,50	8,50	1,06	1,06
13.02.2004	08:00-12:00	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	4,00	0,50	0,00	4,00	4,00	0,50	0,50
16.02.2004						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.2004	08:00-11:00	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	3,00	0,38	0,00	3,00	3,00	0,38	0,38
18.02.2004						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02.2004						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.2004						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.02.2004	08:00-16:30	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	8,50	1,06	0,00	8,50	8,50	1,06	1,06
24.02.2004						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.2004						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2004						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2004	08:00-12:00	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	4,00	0,50		4,00		0,50	
	14:00-17:30	EP.2 Customizing	EP.2-3 Testen	3,50	0,44	0,00	3,50	7,50	0,44	0,94
Summe				56,50	7,06	0,00	56,50	56,50	7,06	7,06

Stundenzettel

Die Auswertung **Stundenzettel** liefert eine Übersicht über die Projektleistungen und Arbeitszeiten der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitintervall. Die Projektleistungen basieren auf den Erfassungsdaten im **TimeTracker** für die **Arbeitspakete** der Mitarbeiter. Die Arbeitszeitdaten werden im **TimeTracker** als "Kommen-Gehen" eingegeben oder können mit Hilfe einer Option als Summe der Projektzeiten automatisch vom System bestimmt werden. Die Abwesenheiten (Urlaub, Krank, Mutterschutz, ...) können dezentral im **TimeTracker** oder zentral in der **Abwesenheitserfassung** definiert werden.

Im Gegensatz zum **Tätigkeitsnachweis** werden hier die Bemerkungen des **TimeTrackers** angezeigt und die Daten der **Arbeitszeitverwaltung** (Urlaubskonten, Krankheit, Gleitzeitzeit) aufgelistet. Optional können auch die Buchungen aus den Arbeitszeitkonten und eine Auflistung der gebuchten Arbeitspakete angezeigt werden.

Datum	Zeiten	Arbeitspaket/Abwesenheit	Plan-Arbeitszeit[h]	Ist-Arbeitszeit[h]	Differenz[h]	Bemerkung
01.02.2004			0,00	0,00	0,00	
02.02.2004		Urlaub		8,00		
			8,00	8,00	0,00	
03.02.2004		Urlaub		8,00		
			8,00	8,00	0,00	
04.02.2004		Urlaub		8,00		
			8,00	8,00	0,00	
05.02.2004		Urlaub		8,00		
			8,00	8,00	0,00	
06.02.2004		Urlaub		8,00		
			8,00	8,00	0,00	
07.02.2004			0,00	0,00	0,00	
08.02.2004			0,00	0,00	0,00	
09.02.2004	08:00-11:00	EP - Projektleitung		3,00		Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern
	13:00-17:00	EP - Konzeptgespräche		4,00		Detailierung Anforderungskatalog
			8,00	7,00	-1,00	
10.02.2004	08:00-10:00	EP - Projektleitung		2,00		Projektmeeting Intern
	13:00-20:00	EP - Konzeptgespräche		7,00		Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle
			8,00	9,00	1,00	
11.02.2004	08:00-12:00,13:00-18:00	EP - Konzeptgespräche		9,00		Schnittstellen Einführung, speziell Schulungen
			8,00	9,00	1,00	
12.02.2004	08:00-13:00,13:30-17:00	EP - Projektleitung		8,50		Koordination und Statusmeeting Vorbereitung Pflichtenheft
			8,00	8,50	0,50	
13.02.2004	08:00-12:00	EP - Projektleitung		4,00		Koordination, Berichtswesen
26.02.2004			8,00	0,00	-8,00	
27.02.2004	08:00-12:00	EP - Projektleitung		4,00		Projektplan überarbeitet, Präsentation vorbereitet
	14:00-17:30	EP - Testen		3,50		Fibu-Schnittstelle
			8,00	7,50	-0,50	
28.02.2004			0,00	0,00	0,00	
Summe			160,00	96,50	-63,50	

Auswertung für Zeitperiode: 01.02.2004 - 28.02.2004

Soll-Stunden: 160,00
Ist-Stunden: 96,50
Saldo: -63,50

Genommener Urlaub: 40,00 (h)
5,00 Tag(e)

Krankheitstage: 0,00 (h)
0,00 Tag(e)

Auswertung zum Stichtag Auswertungsbeginn: 01.02.2004
Gleitzsaldos (alt): -176,00
Resturlaub (alt): 28,00

Auswertung zum Stichtag Auswertungsende: 28.02.2004
Gleitzsaldos (neu): -239,50
Resturlaub (neu): 23,00

Aktuelle Werte zum Zeitpunkt dieser Auswertung: 07.09.2006
Aktuelle Rückfassungsgrenze

Summe Arbeitspakete

Projekt	Arbeitspaket	Dauer (h)
EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	20,00
EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	33,00
EP.2 Customizing	EP.2-3 Testen	3,50
		56,50

Projektzeit Extern/Intern


Die Auswertung **Projektzeit Extern/Intern** liefert eine Übersicht über alle relevanten Arbeitszeitdaten der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitintervall. Zusätzlich zu diesen Informationen werden auch Informationen aus der [Leistungsbewertung](#), der [Abrechnung](#) und der [Reisekostenerfassung](#).

Projektzeit Extern-Intern														
Mitarbeiter	Soll-Arbeitszeit	Ist-Arbeitszeit extern	Ist-Arbeitszeit intern	Ist-Urlaub [h]	Differenz Arbeitszeit	Urlaubsanspruch alt	Ist-Urlaub	Urlaubsanspruch neu	Krank	Fakturierbar	Fakturiert	Auslastung [%]	Pauschalen	Reisekosten
Batzeck Klaus	184,00	176,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	8,00	176,00	0,00	95,65	0,00	0,00
Franke Helene	184,00	171,00	0,00	8,00	-5,00	23,00	1,00	22,00	0,00	171,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Schaub Peter	184,00	157,75	16,25	0,00	-6,00	28,00	0,00	28,00	4,00	174,00	18,00	107,87	81,00	463,45
	552,00	504,75	16,25	8,00	-11,00	62,50	1,00	61,50	12,00	521,00	18,00		81,00	463,45

Mitarbeiter Plan/Ist

Die Auswertung **Mitarbeiter Plan/Ist** liefert eine Übersicht über die geplanten und geleisteten Projektleistungen und Arbeitszeiten der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitintervall. Mit Hilfe dieser Auswertung kann der Anteil von Projektzeit zur Arbeitszeit (Spalte Auslastung) veranschaulicht werden. Die Auslastung bezieht sich auf die "Netto-Arbeitszeit", also die Arbeitszeit ohne die Abwesenheiten.

Die Auswertung kann die Plan- und Ist-Zeiten auch graphisch veranschaulichen, wenn die Option "mit Abbildung" gesetzt ist.

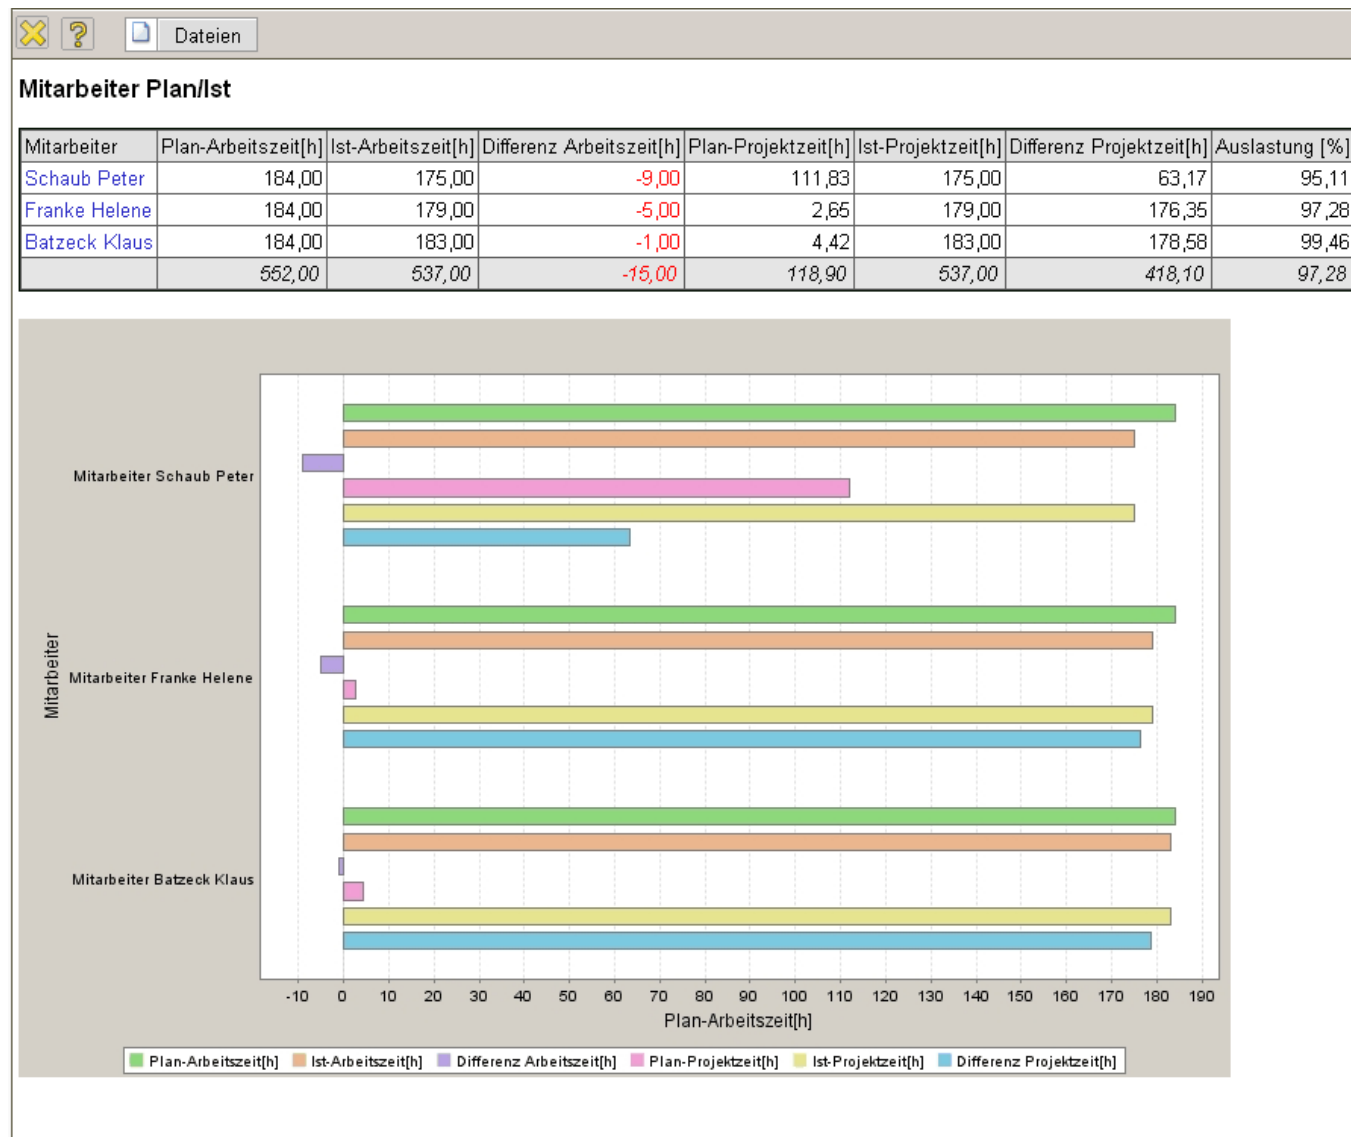

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.12.06_mitarbeiterauswertung&rev=1295947085

Last update: 2019/10/25 14:10

