


[zurück Home weiter](#)

5.08.1 TimeTracker

Die Erfassung der Arbeits- und Projektzeiten sowie der Abwesenheiten wird mit dem TimeTracker realisiert. Diese Komponente befindet sich im Arbeitsbereich und wird durch Mausklick auf die Uhr, im Beispiel für den 11.12.2006, ausgewählt.



Im TimeTracker sind für den Projektmitarbeiter alle Arbeitspakete aufgelistet, die noch nicht abgeschlossen sind und für die er verantwortlich ist. Die Zuordnung der Arbeitspakete zu dem entsprechenden Mitarbeiter, wird im Dokumenttyp Arbeitspakete realisiert. Durch die Anmeldung eines Projektmitarbeiters an das System, wird der Mitarbeiter bestimmt und bekommt im Rahmen der Online-Zeiterfassung die jeweiligen Arbeitspakete angezeigt.

Der TimeTracker besteht aus zwei Teilen: Der obere Bereich dient zur Erfassung von Projektleistungen, Arbeitszeiten und Abwesenheiten. Der untere Bereich dient zur Leistungserfassung auf Arbeitspakete mit Hilfe einer Stoppuhr-Funktionalität (rotes Dreieck in der Zeile des Arbeitspaketes) und als ToDo-Liste.

TimeTracker Schaub Peter
TimeTracker automatisch starten

09.07.2009
von
bis
Dauer
Arbeitspaket
Bemerkung

Donnerstag, 09.07.2009

08:00 - 12:00 = 4:00 h 4-1 Projektleitung - 4 Einführung Projectile

0:00 h 4:00 h

* - = h

* - = h

* - = h

* - = h

| Nummer | Arbeitspaket | Projekt | Auftraggeber | Fälligkeit | Plan-Aufwand | Ist-Zeit | Fertigstellung | Rest |
|--------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|----------|------------------------|------------------------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | <input type="text"/> % | <input type="text"/> h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | <input type="text"/> % | <input type="text"/> h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | <input type="text"/> % | <input type="text"/> h |
| 4.1-2 | Pflichtenheft erstellen | Planung | CONSULT GmbH | 28.07.2009 | 12,00 h | 4,00 h | <input type="text"/> % | <input type="text"/> h |
| 3.1-1 | Spezifikation | Konzeption | CONSULT GmbH | 03.09.2009 | 80,00 h | 11,00 h | <input type="text"/> % | <input type="text"/> h |
| 2-1 | Interne Organisation | Entwicklung | CONSULT GmbH | 10.09.2009 | 8,00 h | 5,00 h | <input type="text"/> % | <input type="text"/> h |
| 4-1 | Projektleitung | Einführung Projectile | CONSULT GmbH | 14.10.2009 | 24,00 h | 8,00 h | <input type="text"/> % | <input type="text"/> h |

In der ToDo-Liste sind alle eigenen Arbeitspakete aufgelistet (für aktive Projekte und Projekte auf Vorleistung). Auf diese Arbeitspakete kann mit Hilfe einer Stoppuhr-Funktionalität die Zeit erfasst werden. Zum Starten der Zeiterfassung wird in der Zeile des betreffenden Arbeitspaketes (hier BS06.2-4 Stammdatenübernahme) auf die Uhr geklickt.

The screenshot shows the TimeTracker interface for user 'Schaub Peter'. The date is set to 09.07.2009. A time entry is recorded from 08:00 to 12:00, totaling 4:00 hours, for the task '4-1 Projektleitung - 4 Einführung Projectile'. Below the entry, there are four empty rows for additional time entries. At the bottom, a table lists project tasks with their planned and actual hours.

| Nummer | Arbeitspaket | Projekt | Auftraggeber | Fälligkeit | Plan-Aufwand | Ist-Zeit | Fertigstellung | Rest |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| Starte Erfassung auf 4.1-1 | g | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| 4.1-2 | Pflichtenheft erstellen | Planung | CONSULT GmbH | 28.07.2009 | 12,00 h | 4,00 h | % | h |
| 3.1-1 | Spezifikation | Konzeption | CONSULT GmbH | 03.09.2009 | 80,00 h | 11,00 h | % | h |
| 2-1 | Interne Organisation | Entwicklung | CONSULT GmbH | 10.09.2009 | 8,00 h | 5,00 h | % | h |
| 4-1 | Projektleitung | Einführung Projectile | CONSULT GmbH | 14.10.2009 | 24,00 h | 8,00 h | % | h |

Die Zeiterfassung auf diese Aufgabe ist jetzt gestartet (hier ab 12:28).

Die Erfassung auf diese Aufgabe wird dann gestoppt, wenn auf die nächste Aufgabe (hier AEI.01.1-1 Konzeptgespräche) gebucht wird.

The screenshot shows the TimeTracker interface with two time entries. The first entry is from 08:00 to 10:00 (2:00 h) for '4-1 Projektleitung - 4 Einführung Projectile'. The second entry starts at 10:27 for '4.1-1 Konzeptgespräche - 4.1 Planung'. The total time recorded is 2:00 h. The table at the bottom highlights the first task.

| Nummer | Arbeitspaket | Projekt | Auftraggeber | Fälligkeit | Plan-Aufwand | Ist-Zeit | Fertigstellung | Rest |
|--------|------------------|---------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |

Im Beispiel ist die zweite Aufgabe um 13:30 begonnen worden, also endet hier auch die Erfassung auf das erste Arbeitspaket.


| Nummer | Arbeitspaket | Projekt | Auftraggeber | Fälligkeit | Plan-Aufwand | Ist-Zeit | Fertigstellung | Rest |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 0,02 h | % | h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| | Stoppe Erfassung auf 3-1 | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |

Wenn die Uhr erneut geklickt wird, endet die Zeiterfassung. Im Beispiel unten wurden 1:02 Stunden für die Aufgabe BS06.2-4 erfasst. Anschließend wurden 1:00 Stunden auf das Arbeitspaket AEI01.1-1 gebucht, also insgesamt 2:02 h Projektzeiten erfasst.


Die Erfassungsdaten können noch mit Bemerkungen versehen und abgespeichert werden.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Erfassung von Leistungen, Anwesenheiten und Abwesenheiten im oberen Teil (TimeSheet) realisiert wird. Mit Hilfe der Zeitfelder werden Uhrzeiten bzw. Gesamtstunden eingetragen. Die ersten beiden Spalten definieren die Start-Uhrzeit (von) und die Ende-Uhrzeit (bis). In der dritten Spalte ist die Dauer aufgelistet, also die zeitliche Differenz zwischen Start- und Stop-Uhrzeit. In der letzten Spalte können die Arbeitspakete oder die Kennzeichen für Anwesenheiten und Abwesenheiten ausgewählt und der Zeit zugewiesen werden.

Im Beispiel unten wurden 3:30 Stunden für die Aufgabe Projektleitung erfasst. Anschließend wurden drei Stunden ab 14:00 auf das Arbeitspaket Konzeptgespräche gebucht und abschließend ist auf die Aufgabe Schnittstelle anpassen und konfigurieren eine Dauer von einer Stunde erfasst worden. Zu jedem Zeiteintrag sind vom Benutzer ergänzende Bemerkungen eingetragen worden.

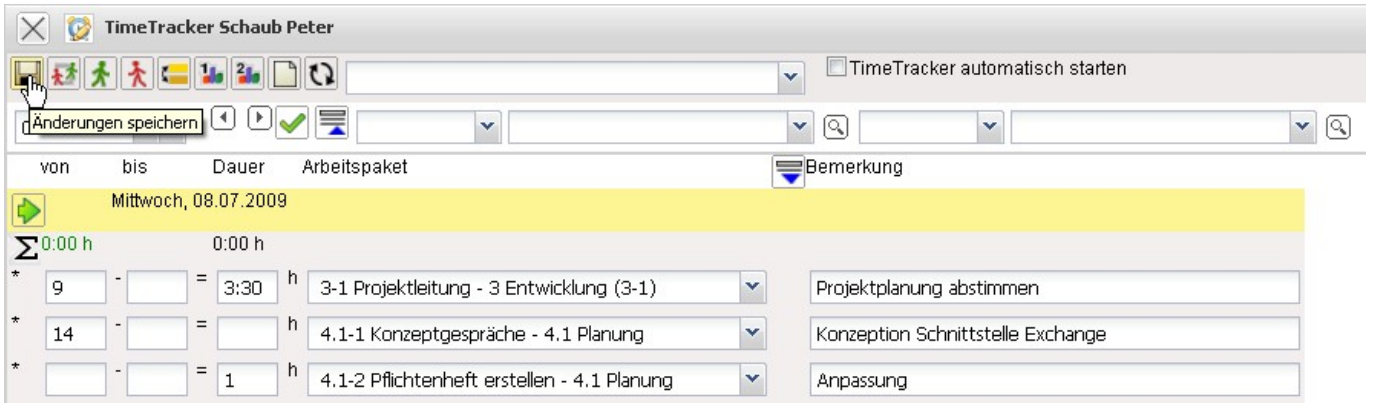


Durch Abspeichern komplettiert das System die fehlenden Werte.

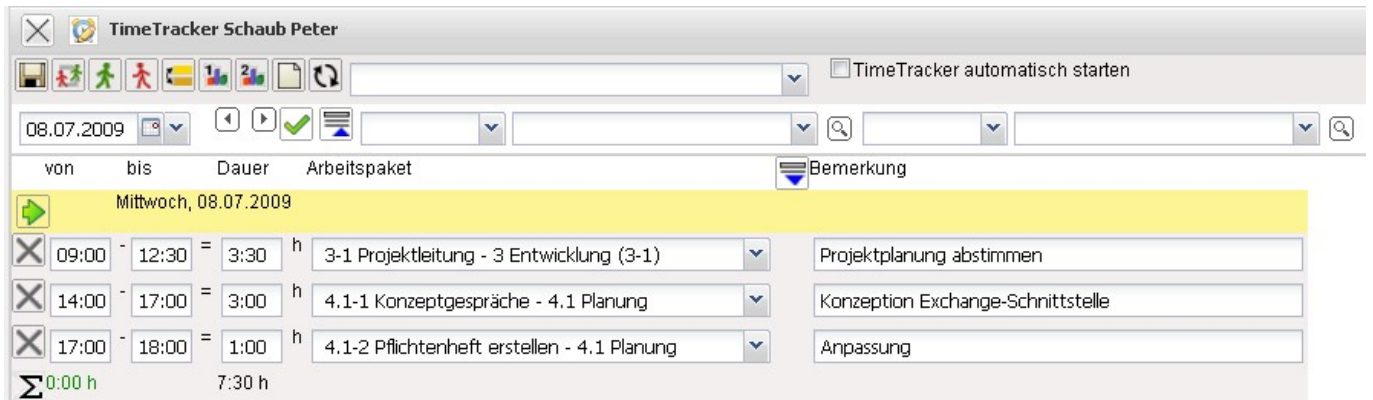


Die erfassten Zeiten erscheinen nach dem Speichervorgang auch im unteren Teil des TimeTrackers (ToDo-Liste) bei den jeweiligen Arbeitspaketen in der Spalte Ist-Zeit.


Im TimeTracker können auch Zeiten nacherfasst werden. Mit Hilfe des Datumselementes kann der Tag der Erfassung verändert werden. Im Beispiel unten sollen Zeiten für gestern nacherfasst werden. Die Funktion "vorheriger" im Datumselement ändert ...




... das Erfassungsdatum ab und ...



... die Nacherfassung von Zeiten kann vorgenommen werden.

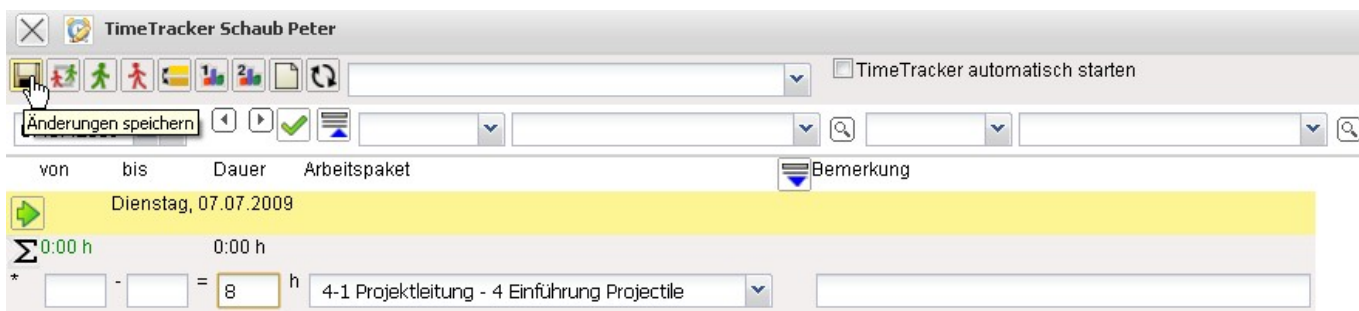

Um auf ein beliebiges Datum zu wechseln kann der Kalender direkt verwendet werden. Ein Klick auf den Tag ...



... ändert das Erfassungsdatum.

Anmerkung: Es kann in der Regel nicht beliebig weit nacherfasst werden. In der Konfiguration des TimeTrackers kann die Rückerfassungsgrenze und weitere Erfassungsregeln definiert werden. Darüber hinaus kann die Zeiterfassung manuell oder mit Hilfe der Workflow-Engine gesetzt werden.

Neben den Projekt- und Arbeitszeiten können im TimeTracker auch Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, Mutterschutz, Militärdienst, ...) erfasst werden.

Im Beispiel sind acht Stunden Urlaub ...



... für den 07.12.2006 nacherfasst worden.

Hinter der Spalte Ist-Zeit gibt es noch zwei weitere Spalten: Fertigstellung und Restdauer. In der

Spalte Fertigstellung kann man den Prozentwert eingeben, zu dem das Arbeitspaket inhaltlich fertiggestellt ist. In der Spalte Rest kann alternativ der Restaufwand für diese Aufgaben in Stunden geschätzt werden.

The screenshot shows the 'TimeTracker Schaub Peter' interface. At the top, there are navigation icons and a date selector set to '02.07.2009'. Below this, a summary for 'Donnerstag, 02.07.2009' shows a total of 8:00 h. A list of tasks is displayed with columns: Nummer, Arbeitspaket, Projekt, Auftraggeber, Fälligkeit, Plan-Aufwand, Ist-Zeit, Fertigstellung, and Rest. The 'Fertigstellung' column contains percentage values, and the 'Rest' column contains remaining hours.

| Nummer | Arbeitspaket | Projekt | Auftraggeber | Fälligkeit | Plan-Aufwand | Ist-Zeit | Fertigstellung | Rest |
|--------|-------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 3,02 h | 25 % | h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 4,52 h | % | 16 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| 4.1-2 | Pflichtenheft erstellen | Planung | CONSULT GmbH | 28.07.2009 | 12,00 h | 1,00 h | % | h |
| 3.1-1 | Spezifikation | Konzeption | CONSULT GmbH | 03.09.2009 | 80,00 h | 2,00 h | % | h |
| 2-1 | Interne Organisation | Entwicklung | CONSULT GmbH | 10.09.2009 | 8,00 h | 5,00 h | % | h |

Nach dem Abspeichern der Werte für die Schätzungen, wird entweder die verbleibende Restdauer oder der Fertigstellungsgrad vom System automatisch errechnet und eingetragen. Im Beispiel ist für die zweite Aufgabe ein Fertigstellungsgrad von 25% geschätzt worden. Bei einer aktuellen Ist-Zeit von 9h entsprechen 25% einer geschätzten Plandauer von 36h ⇒ Restaufwand = 27h..

| Nummer | Arbeitspaket | Projekt | Auftraggeber | Fälligkeit | Plan-Aufwand | Ist-Zeit | Fertigstellung | Rest |
|--------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|--------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 3,02 h | 25 % | 9,05 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 4,52 h | 22,01 % | 16 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| 4.1-2 | Pflichtenheft erstellen | Planung | CONSULT GmbH | 28.07.2009 | 12,00 h | 1,00 h | % | h |
| 3.1-1 | Spezifikation | Konzeption | CONSULT GmbH | 03.09.2009 | 80,00 h | 2,00 h | % | h |
| 2-1 | Interne Organisation | Entwicklung | CONSULT GmbH | 10.09.2009 | 8,00 h | 5,00 h | 83,33 % | 1 h |
| 4-1 | Projektleitung | Einführung Projectile | CONSULT GmbH | 14.10.2009 | 24,00 h | 10,00 h | % | h |

Bei der vierten Aufgabe ist bei der Ist-Zeit von 11h ein Restaufwand von 26h geschätzt worden. Die Aufgabe wird (nach dieser Schätzung) also $11h + 26h = 37h$ dauern und das macht bei der aktuellen Ist-Zeit einen Fertigstellungsgrad von 29,73%.

Anmerkung: Dieser lineare Zusammenhang zwischen Fertigstellungsgrad und Restaufwand geht von der Vereinfachung aus, dass die erste Hälfte genauso lange dauert wie die zweite Hälfte. Der Administrator kann im Administrationsmenü diesen linearen Zusammenhang auch unterbinden.

In der ToDo-Liste können die Arbeitspakete auch abgeschlossen werden. Diese Rückmeldung ist wichtig für das Auswertungssystem (Statusinformation) und hält die ToDo-Liste übersichtlich. Ein Arbeitspaket wird abgeschlossen, wenn der Benutzer mit der Maus auf das grüne Häkchen klickt und den Dialog bestätigt.

| Nummer | Arbeitspaket | Projekt | Auftraggeber | Fälligkeit | Plan-Aufwand | Ist-Zeit | Fertigstellung | Rest |
|--------|------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|--------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 3,02 h | 25 % | 9,05 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 4,52 h | 22,01 % | 16 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| 4.1-2 | Pflichtenheft erstellen | Planung | CONSULT GmbH | 28.07.2009 | 12,00 h | 1,00 h | % | h |
| 3.1-1 | Spezifikation | Konzeption | CONSULT GmbH | 03.09.2009 | 80,00 h | 2,00 h | % | h |
| 2-1 | Interne Organisation | Entwicklung | CONSULT GmbH | 10.09.2009 | 8,00 h | 5,00 h | 83,33 % | 1 h |
| 4-1 | Arbeitspaket abschließen 2-1 | Entwicklung | CONSULT GmbH | 14.10.2009 | 24,00 h | 10,00 h | % | h |

Nach dem Abschließen eines Arbeitspaketes ...



... ist die Aufgabe schreibgeschützt, der Fertigstellungsgrad wird auf 100% gesetzt und am nächsten

Tag wird das Arbeitspaket aus der ToDo-Liste vom System entfernt.

| ⊖ Nummer | ⊖ Arbeitspaket | ⊖ Projekt | ⊖ Auftraggeber | ⬆ Fälligkeit | ⊖ Plan-Aufwand | ⊖ Ist-Zeit | ⊖ Fertigstellung | Rest |
|----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 3,02 h | 25 % | 9,05 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 4,52 h | 22,01 % | 16 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| 4.1-2 | Pflichtenheft erstellen | Planung | CONSULT GmbH | 28.07.2009 | 12,00 h | 1,00 h | % | h |
| 3.1-1 | Spezifikation | Konzeption | CONSULT GmbH | 03.09.2009 | 80,00 h | 2,00 h | % | h |
| 2-1 | Interne Organisation | Entwicklung | CONSULT GmbH | 10.09.2009 | 8,00 h | 5,00 h | 100% | 0h |


Das Arbeitspaket kann von Benutzern mit entsprechender Berechtigung wieder geöffnet werden (Ist-Ende im Arbeitspaket leeren).

Aus der ToDo-Liste kann (bei entsprechender Berechtigung) auch auf die Arbeitspakete oder Projekte verlinkt werden ...


| ⊖ Nummer | ⊖ Arbeitspaket | ⊖ Projekt | ⊖ Auftraggeber | ⬆ Fälligkeit | ⊖ Plan-Aufwand | ⊖ Ist-Zeit | ⊖ Fertigstellung | Rest |
|----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------|
| 4.1-1 | Konzeptgespräche | Planung | CONSULT GmbH | 15.07.2009 | 16,00 h | 3,02 h | 25 % | 9,05 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 4,52 h | 22,01 % | 16 h |
| 3-1 | Projektleitung | Entwicklung | CONSULT GmbH | 17.07.2009 | 16,00 h | 0,00 h | % | h |
| 4.1-2 | Pflichtenheft erstellen | Planung | CONSULT GmbH | 28.07.2009 | 12,00 h | 1,00 h | % | h |
| 3.1-1 | Spezifikation | Konzeption | CONSULT GmbH | 03.09.2009 | 80,00 h | 2,00 h | % | h |

... um beispielsweise Arbeitsanweisungen oder Informationen zur Aufgabe einzusehen.

Im TimeTracker können auch Arbeitszeiten (beispielsweise für die Verwaltung von Gleitzeitständen) verwaltet werden. Im folgenden Beispiel werden zunächst 7:00h Projektzeiten auf die Aufgabe Projektleitung und Konzeptgespräche erfasst. Anschließend wird von 8:30 bis 17:30 Arbeitszeit ("Kommen und Gehen") und eine Pause zwischen 13:30 und 14:15 Uhr definiert.

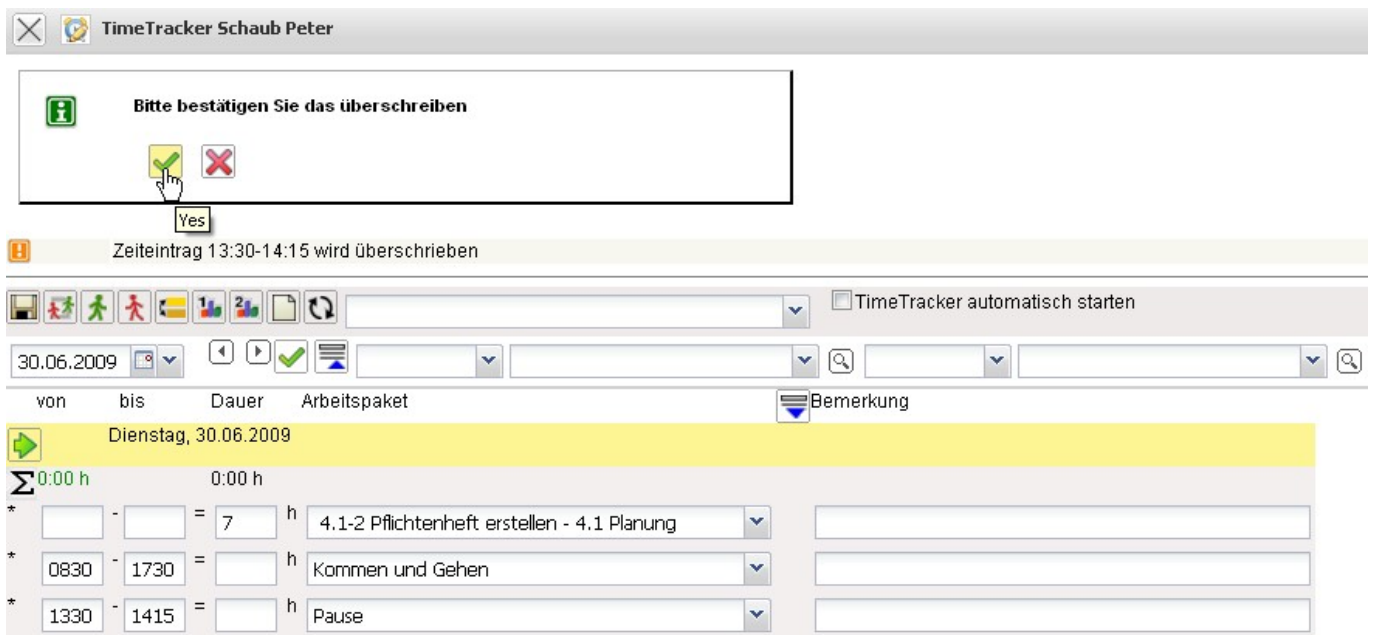

Nach Bestätigung der Warnung ...

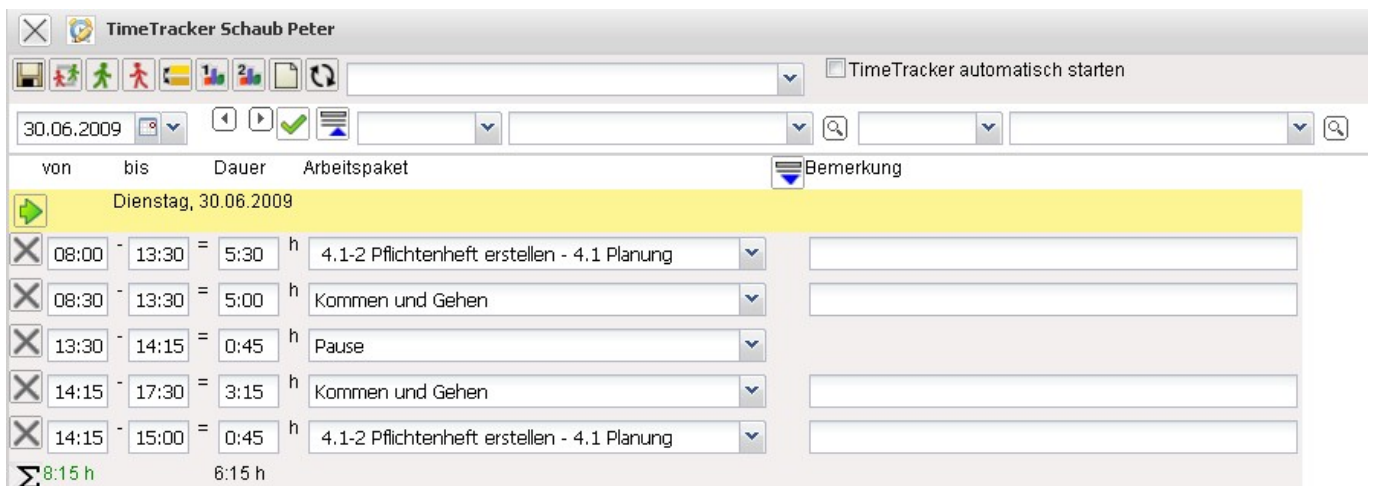


... vervollständigt das System wieder das TimeSheet. Aus den 7:00h Projektzeit sind 6:30h geworden, da der Benutzer eine Pause von 13:30 bis 14:15 definiert hat. Die Arbeitszeit beträgt 8:15h.

Im TimeTracker kann jeder Mitarbeiter für sich selbst und einen frei definierbaren Zeitraum Auswertungen erzeugen. Im Beispiel werden die Zeitnachweise aufgerufen, ...



... der Betrachtungszeitraum eingeschränkt und ggf. das Ausgabeformat ausgewählt ...



... und die Auswertung generiert.



Zeitnachweise

| Arbeitspaket | Projekt | Mitarbeiter | Tätigkeit | Ist [h] | Ist-Beginn | Ist-Ende |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------|------------|------------|
| 2-1 Interne Organisation | 2 Entwicklung | Schaub Peter | Allgemeine Tätigkeit | 5,00 | 01.07.2009 | 01.07.2009 |
| | 2 Entwicklung | | | 5,00 | | |
| 3-1 Projektleitung | 3 Entwicklung | Schaub Peter | Projektleitung | 4,52 | 08.07.2009 | 09.07.2009 |
| | 3 Entwicklung | | | 4,52 | | |
| 3.1-1 Spezifikation | 3.1 Konzeption | Schaub Peter | Analyse | 2,00 | 01.07.2009 | 01.07.2009 |
| | 3.1 Konzeption | | | 2,00 | | |
| 4-1 Projektleitung | 4 Einführung Projectile | Schaub Peter | Projektleitung | 10,00 | 07.07.2009 | 09.07.2009 |
| | 4 Einführung Projectile | | | 10,00 | | |
| 4.1-1 Konzeptgespräche | 4.1 Planung | Schaub Peter | Beratung | 3,02 | 08.07.2009 | 09.07.2009 |
| 4.1-2 Pflichtenheft erstellen | 4.1 Planung | Schaub Peter | Analyse | 1,00 | 08.07.2009 | 08.07.2009 |
| | 4.1 Planung | | | 4,02 | | |
| | Summe | | | 25,53 | | |

Einzelnachweise

| Datum | Dauer | Projekt | Arbeitspaket | Tätigkeit | Mitarbeiter | Bemerkung |
|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 01.07.2009 | 5,00 | 2 Entwicklung | 2-1 Interne Organisation | Allgemeine Tätigkeit | Schaub Peter | |
| 01.07.2009 | 2,00 | 3.1 Konzeption | 3.1-1 Spezifikation | Analyse | Schaub Peter | |
| 07.07.2009 | 8,00 | 4 Einführung Projectile | 4-1 Projektleitung | Projektleitung | Schaub Peter | |
| 08.07.2009 | 3,50 | 3 Entwicklung | 3-1 Projektleitung | Projektleitung | Schaub Peter | Projektplanung abstimmen |
| 08.07.2009 | 3,00 | 4.1 Planung | 4.1-1 Konzeptgespräche | Beratung | Schaub Peter | Konzeption Exchange-Schnittstelle |
| 08.07.2009 | 1,00 | 4.1 Planung | 4.1-2 Pflichtenheft erstellen | Analyse | Schaub Peter | Anpassung |
| 09.07.2009 | 1,02 | 3 Entwicklung | 3-1 Projektleitung | Projektleitung | Schaub Peter | Entwicklung neues Modul |
| 09.07.2009 | 2,00 | 4 Einführung Projectile | 4-1 Projektleitung | Projektleitung | Schaub Peter | Planung für Einführung Consult |

Diese Auswertung liefert eine Übersicht über die Projektleistungen der Mitarbeiter und die Auflistung der einzelnen Tätigkeiten mit den Bemerkungen aus der Zeiterfassung.

Das nächste Beispiel zeigt die Auswertung "Stundenzettel".



Diese Auswertung liefert eine Übersicht über die Projektleistungen und Arbeitszeiten der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitintervall. Die Projektleistungen basieren auf den Erfassungsdaten im TimeTracker für die Arbeitspakete der Mitarbeiter.

Stundenzettel

Schaub, Peter Personalnummer

| Datum Gesamt | Wochentag Gesamt | Zeiten Gesamt | Arbeitspaket/Abwesenheit Gesamt | Arbeitspaket Gesamt | Plan-Arbeitszeit[h] Gesamt | Ist-Arbeitszeit[h] Gesamt | Differenz[h] Gesamt | Bemerkung Gesamt |
|--------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 01.07.2009 | Mi. | 08:00-13:00 | 2 - Interne Organisation | 2-1 Interne Organisation | | 5,00 | | |
| | | 13:00-15:00 | 3 - Spezifikation | 3.1-1 Spezifikation | | 2,00 | | |
| | | | | | 8,00 | 7,00 | -1,00 | |
| 02.07.2009 | Do. | 08:00-16:00 | Urlaub | | | 8,00 | | |
| | | | | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |
| 03.07.2009 | Fr. | | | | 8,00 | 0,00 | -8,00 | |
| 04.07.2009 | Sa. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.07.2009 | So. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.07.2009 | Mo. | 08:00-16:00 | Urlaub | | | 8,00 | | |
| | | | | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |
| 07.07.2009 | Di. | 08:00-16:00 | 4 - Projektleitung | 4-1 Projektleitung | | 8,00 | | |
| | | | | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |
| 08.07.2009 | Mi. | 09:00-12:30 | 3 - Projektleitung | 3-1 Projektleitung | | 3,50 | | Projektplanung abstimmen |
| | | 14:00-17:00 | 4 - Konzeptgespräche | 4.1-1 Konzeptgespräche | | 3,00 | | Konzeption Exchange-Schnittstelle |
| | | 17:00-18:00 | 4 - Pflichtenheft erstellen | 4.1-2 Pflichtenheft erstellen | | 1,00 | | Anpassung |
| | | | | | 8,00 | 7,50 | -0,50 | |
| 09.07.2009 | Do. | 08:00-10:00 | 4 - Projektleitung | 4-1 Projektleitung | | 2,00 | | Planung für Einführung Consult |
| | | 10:27-10:28 | 4 - Konzeptgespräche | 4.1-1 Konzeptgespräche | | 0,02 | | Planung grundlegendes Konzept |
| | | 10:28-11:29 | 3 - Projektleitung | 3-1 Projektleitung | | 1,02 | | Entwicklung neues Modul |
| | | | | | 8,00 | 3,03 | -4,97 | |
| 10.07.2009 | Fr. | | | | 8,00 | 0,00 | -8,00 | |
| Summe | | | | | 64,00 | 41,53 | -22,47 | |

Auswertung für Zeitperiode: 01.07.2009 - 10.07.2009
 Soll-Stunden 64,00
 Ist-Stunden 41,53
 Saldo -22,47

Urlaub 16,00 (h)
 2,00 Tag(e)

Krankheitstage 0,00 (h)
 0,00 Tag(e)

Auswertung zum Stichtag Auswertungsbeginn: 01.07.2009
 Gleitzeitsaldo (alt): Kein Vertrag
 Resturlaub (alt): Kein Vertrag

Auswertung zum Stichtag Auswertungsende: 08.07.2009
 Gleitzeitsaldo (neu): Kein Vertrag
 Resturlaub (neu): Kein Vertrag

Aktuelle Werte zum Zeitpunkt dieser Auswertung: 09.07.2009
 Summe ausbezahlte Zeit 0,00
 Aktuelle Rückerfassungsgrenze

Summe Arbeitspakete

| Projekt | Arbeitspaket | Dauer (h) |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 3 Entwicklung | 3-1 Projektleitung | 4,52 |
| 3.1 Konzeption | 3.1-1 Spezifikation | 2,00 |
| 4.1 Planung | 4.1-1 Konzeptgespräche | 3,02 |
| 4 Einführung Projectile | 4-1 Projektleitung | 10,00 |
| 2 Entwicklung | 2-1 Interne Organisation | 5,00 |
| 4.1 Planung | 4.1-2 Pflichtenheft erstellen | 1,00 |
| | | 25,53 |

Anmerkung: Die im TimeTracker hinterlegten Auswertungen sind vom Administrator konfigurierbar.

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.08_zeiterfassung&rev=1247138885



Last update: **2019/10/25 14:10**
