

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 4.12.01 Bedienung der Standardauswertungen

Projectile beinhaltet zahlreiche [Standardauswertungen](#). Die Auswertungen sind nach Themen in Auswertungsblöcke gruppiert und beinhalten zwischen einer und bis zu 13 Einzelauswertungen.

Die Auswertungen können im Arbeitsbereich mit Hilfe der Funktionalität "Auswerten" geöffnet werden.



Im folgenden Beispiel werden einige [projektbezogene Auswertungen](#) vorgestellt. Dazu gehört die [Projektübersicht](#), der [Projektstrukturplan](#), [Plan/Ist-Vergleiche](#) für Projekte und [Arbeitspakete](#), die [Meilenstein-Trend-Analyse](#), die [Visualisierung von Fertigstellungsgraden](#), [Zeitnachweise](#) und die Skill-Matrix.

Nach Öffnen der Auswertungsart (hier die Projektauswertungen) öffnet sich ein Auswertungsdokument. Im Dokument können Selektionskriterien und Optionen der Auswertung konfiguriert werden.

1. Name: Wenn Sie die Kriterien der Auswertung speichern möchten, geben Sie einen Namen an

**Bezeichnung**

**Auswertung**

**Report-Zusammenstellung**

2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine. Achtung: Alle Dokumente, die in der Eingabebox aufgeführt sind, werden ausgewertet. Zum Entfernen Dokumente markieren und Option "entfernen" auswählen. Auch nicht markierte Dokumente werden berücksichtigt!

**Profisuche**

**Schnellsuche**  **Kategorie**

**Eingabedaten**

3. Hauptparameter: Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:

**Auswertungszeitraum**

**Start**

**Ende**


Im ersten Teil (1. Name) kann für die Auswertung ein Name vergeben werden, falls die Auswertung abgespeichert wird. Das Speichern der Auswertung ist sinnvoll, wenn die Selektionskriterien der Auswertungen konstant bleiben (beispielsweise eine Auflistung aller aktiven Projekte für das aktuelle Quartal). Diese abgespeicherte Auswertung kann in die persönliche Ablage übernommen werden oder die Basis für einen [Zeitdienst](#) darstellen, um Auswertungen zu automatisieren. Darüber hinaus können Auswertungen auch im Hintergrund erzeugt werden. Um die Auswertungsergebnisse anzuzeigen, muss die Auswertung ebenfalls abgespeichert sein.

Im zweiten Teil (2. Eingabedaten) werden die Eingabedaten der Auswertung bestimmt. Im dritten Teil (3. Hauptkriterien) können die Eingabedaten zeitlich eingeschränkt werden.

Im ersten Beispiel werden als Selektionskriterien für die Eingabedaten zwei Projekte aus der persönlichen Ablage ausgewählt.



Diese Projekte werden in der Ablage markiert, ...

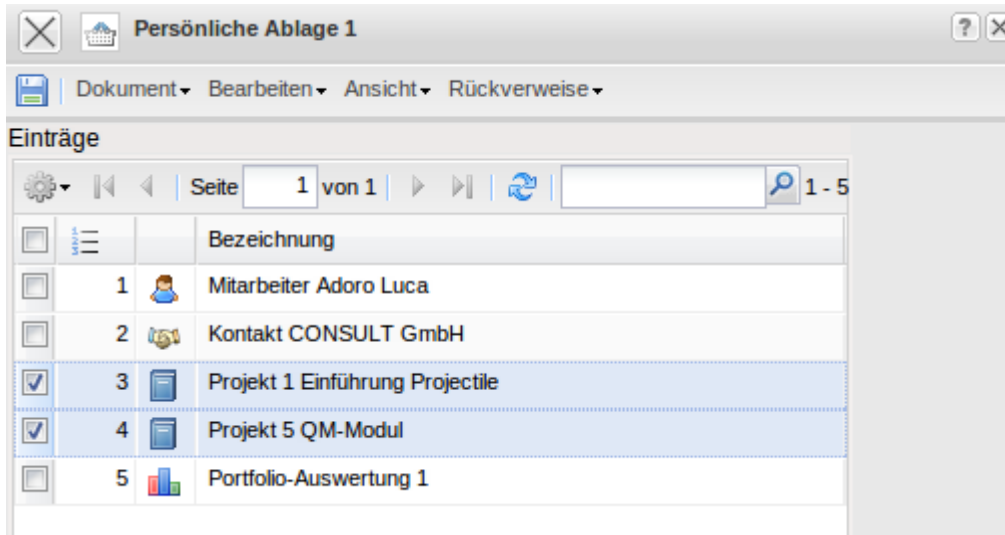


... kopiert und ...



... in die Eingabedaten eingefügt.



Dieser Vorgang kann mehrfach (oder mit mehreren Einträgen) durchgeführt werden. Im Beispiel unten sind ...




... die Projekte 138 und 140 die Selektionskriterien.

Anschließend wird der Betrachtungszeitraum der Auswertung ...



... auf das aktuelle Kalenderjahr eingeschränkt ...



... und die Auswertung "Arbeitspakete Plan/Ist" mit Hilfe von  ausgeführt.



Wenn die Auswertungsergebnisse erzeugt sind, präsentiert das System das Ergebnis im Browser. Diese Auswertung beinhaltet Informationen bezüglich der Projekte, Vorgänge bzw. Arbeitspakete und Bearbeiter, der Plan- und Ist-Zeiten mit Restaufwand und der entsprechenden Differenz (Plan - Ist), den geplanten Abarbeitungszeitraum (Beginn/Ende) und die Statusinformationen (Status, Abschlussdatum und Fertigstellungsgrad der Aufgabe).



Durch das Schließen des Auswertungsergebnisses gelangt man wieder in den Auswertungsblock Projektauswertung.



Wenn der Auswertungsblock abgespeichert wird, kann der Auswertungsblock als Basis für Zeitdienste oder für Auswertungen im Hintergrund verwendet werden.



Mit Hilfe von  kann die Auswertung im Hintergrund gestartet werden.



Das System informiert über den Hintergrund-Prozess ...



... und erzeugt ...



... eine interne Benachrichtigung, sobald das Auswertungsergebnis generiert ist.



Im Mailer erscheint dann die Nachricht und der Benutzer kann über den Link auf das ...



... Auswertungsergebnis verlinken.



Im zweiten Beispiel wird die Standard-Suchmaschine für die Auswahl der Eingabedaten verwendet. Hier werden beispielsweise alle Projekte (ausgewählte Kategorie), ...



... die den Begriff "Projectile" enthalten ...

Schnellsuche Kategorie

Projectile Projekt

Eingabedaten

Seite 1 von 1

<input type="checkbox"/>	1	1 Einführung Projectile
<input type="checkbox"/>	2	1.1 Planung
<input type="checkbox"/>	3	1.2 Customizing
<input type="checkbox"/>	4	1.3 Einführung
<input type="checkbox"/>	5	12 Projectile
<input type="checkbox"/>	6	12.1 Entwicklung
<input type="checkbox"/>	7	12.2 Programmierung
<input type="checkbox"/>	8	12.3 Fertigstellung
<input type="checkbox"/>	9	12.4 Testen
<input type="checkbox"/>	10	12.5 Fehler beheben

... als Eingabedaten verwendet. Einträge, die nicht als Selektionskriterien verwendet werden sollen, werden markiert, die Auswahl invertiert ...



... und die Einträge aus den Eingabedaten entfernt:



Es werden alle Einträge der Auswahl ausgewertet (**nicht nur die markierten**)!



Dieser Vorgang kann mehrfach (mit verschiedenen Kategorien) durchgeführt werden. Abschließend wird die Auswertung wieder mit ausgeführt (im beispiel ein Plan/Ist-Vergleich für die Projekte 138 und 140):

Dateien


**Arbeitspakete Plan/Ist**

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Plan [h]	Ist [h]	Differenz [h]	Beginn	Ende	Status	Progn. Rest	FG geschätzt
1 Einführung Projectile	1-1 Projektleitung	Hansen Frank	21,96	0,00	21,96	01.02.2011	31.01.2012	geplant	24,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-2 Konzeptgespräche	Adoro Luca	14,64	51,25	-36,61	01.02.2011	31.01.2012	in Arbeit	0,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-3 Pflichtenheft erstellen	Adoro Luca	10,98	47,00	-36,02	01.02.2011	31.01.2012	in Arbeit	0,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-4 Entwicklung	Hansen Frank	58,55	0,00	58,55	01.02.2011	31.01.2012	geplant	64,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-5 Dokumentation	Adoro Luca	18,30	37,33	-19,04	01.02.2011	31.01.2012	in Arbeit	0,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-6 Testen	Hansen Frank	7,32	0,00	7,32	01.02.2011	31.01.2012	geplant	8,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-7 Installation/Konfiguration	Hermes Gustav	0,00	0,00	0,00	01.02.2011	28.02.2010	erledigt, verspätet	0,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-8 Schulung	Hansen Frank	14,64	0,00	14,64	01.02.2011	31.01.2012	geplant	16,00	0,00
1.3 Projectile-Einführung	1.3-1 Projektleitung	Adoro Luca	7,32	0,00	7,32	01.02.2011	31.01.2012	geplant	8,00	0,00
12.4 Testen	12.4-1 Qualität sicherstellen	Adoro Luca	32,00	0,00	32,00	09.03.2011	09.04.2011	geplant	32,00	0,00
			185,70	135,58	50,11				152,00	

Die dritte Möglichkeit die Eingabedaten auszuwählen, ist die Profi-Suche. Hier sind entsprechende Suchabfragen hinterlegt, die sofort verwendet werden können.



Im Beispiel werden alle Hauptprojekte mit dem Status "aktiv" in die Eingabedaten übertragen.



Anschließend kann der Betrachtungszeitraum (3. Hauptparameter) und die weiteren Kriterien verwendet werden (4. Parameter), um die Ergebnisse der Auswertungen sinnvoll einzuschränken. Zu diesen Parametern gehört beispielsweise die Kostenstelle des Projektes, die Projektart, der Projektstatus, die Priorität und das Kennzeichen, ob das Projekt ein externer Auftrag ist oder nicht.



Die weiteren Optionen betreffen die Filterung von Ergebnissen.




Im Beispiel werden alle Projekte ausgewertet, die der Kostenstelle Nürnberg zugeordnet sind, ein Soll- oder Muss-Projekt sind ...



... sowie das Kennzeichen "Externer Auftrag" besitzen.


Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Plan [h]	Ist [h]	Differenz [h]	Beginn	Ende	Ist-Ende	Status	Progn. Rest	FG geschätzt
1 Einführung Projectile	1-1 Projektleitung	Hansen Frank	21,96	0,00	21,96	01.02.2011	31.01.2012		geplant	24,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-2 Konzeptgespräche	Adoro Luca	14,64	51,25	-36,61	01.02.2011	31.01.2012		in Arbeit	0,00	100,00
1 Einführung Projectile	1-3 Pflichtenheft erstellen	Adoro Luca	10,98	47,00	-36,02	01.02.2011	31.01.2012		in Arbeit	0,00	100,00
1 Einführung Projectile	1-4 Entwicklung	Hansen Frank	58,55	0,00	58,55	01.02.2011	31.01.2012		geplant	64,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-5 Dokumentation	Adoro Luca	14,64	37,33	-22,70	01.02.2011	31.01.2012		in Arbeit	0,00	100,00
1 Einführung Projectile	1-6 Testen	Hansen Frank	7,32	0,00	7,32	01.02.2011	31.01.2012	09.03.2011	erledigt	0,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-7 Installation/Konfiguration	Hermes Gustav	8,00	0,00	8,00	01.02.2011	28.02.2011		geplant, verspätet	8,00	0,00
1 Einführung Projectile	1-8 Schulung	Hansen Frank	14,64	0,00	14,64	01.02.2011	31.01.2012	09.03.2011	erledigt	0,00	0,00
1.3 Projectile-Einführung	1.3-1 Projektleitung	Adoro Luca	7,32	0,00	7,32	01.02.2011	31.01.2012		geplant	8,00	0,00
			158,04	135,58	22,45					104,00	

Auf dem Reiter "Format" (5. Einstellungen zur Ansicht) können beispielsweise die Breite der Abbildungen in Pixel und der Diagrammtyp ausgewählt werden.

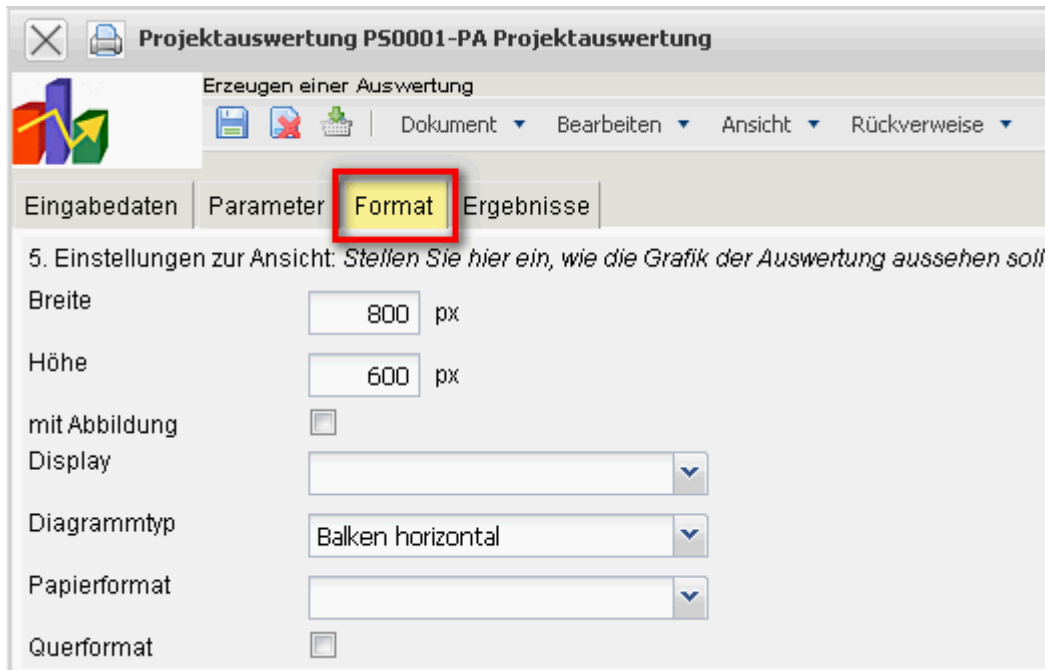


Wenn alternative Ausgabeformate gewünscht sind (standardmäßig werden alle Auswertungen in HTML innerhalb der Applikation erzeugt) kann im Element "Display" das Ausgabeformat gewählt werden.

Im folgenden Beispiel wird die Auswertung Arbeitspakete Plan/Ist mit Abbildungen (Diagrammtyp "Balken 3D vertikal) ...

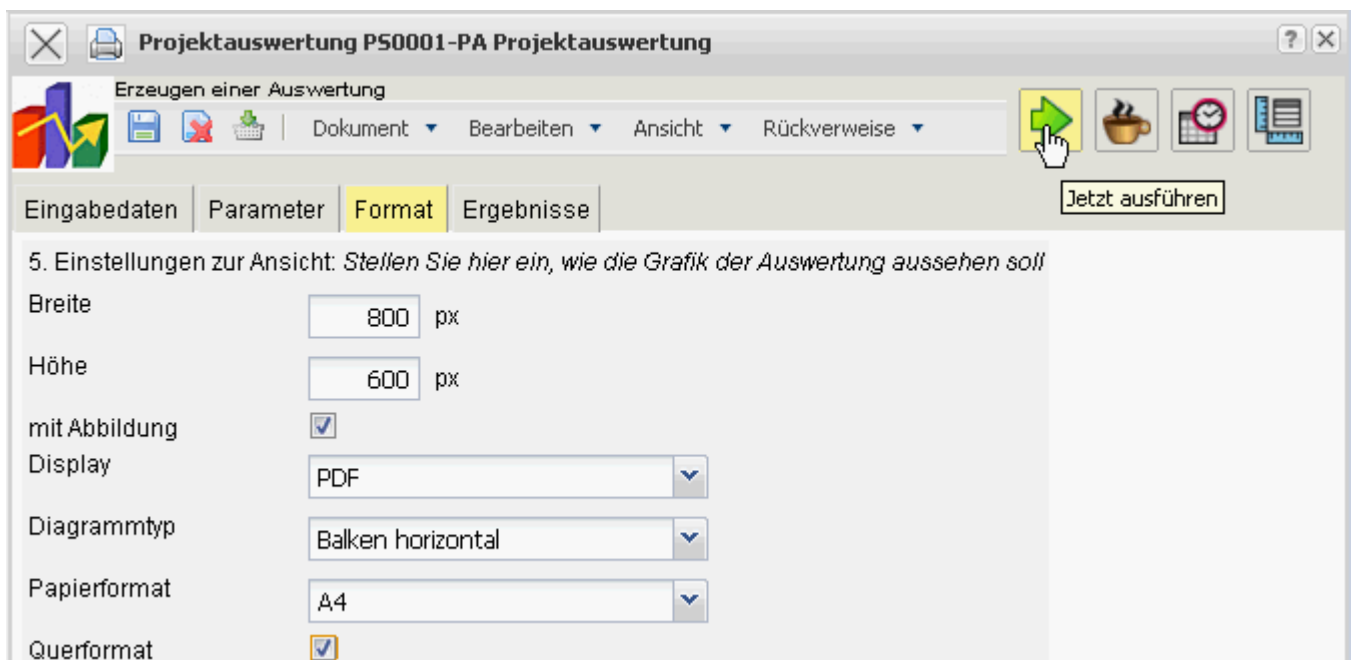

... im Ausgabeformat PDF erzeugt.

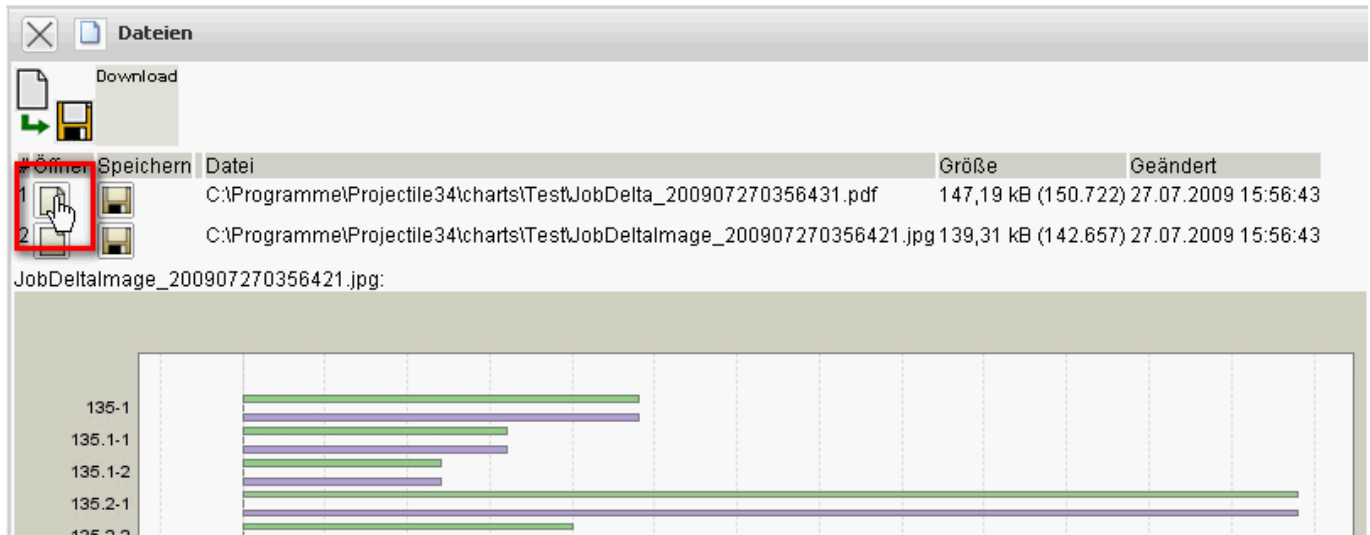

Je nach Systemeinstellung öffnet sich die erzeugte Auswertung im Browser ...

... oder im entsprechenden Anzeigeprogramm ...

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Plan[h]	Delta[h]	Rest[h]	Plan-Start	Plan-Ende	Ist-Ende	Status	FG[%]
135 Einführung Projectile	135-1 Projektleitung	Smith Frank	24,00	24,00	24,00	30.06.2009	02.07.2009		geplant, verspätet	0,00
135.1 Planung	135.1-1 Konzeptgespräche	Green Nicola	16,00	16,00	16,00	30.06.2009	03.07.2009		geplant, verspätet	0,00
135.1 Planung	135.1-2 Pflichtenheft erstellen	Green Nicola	12,00	12,00	12,00	06.07.2009	06.07.2009		geplant, verspätet	0,00
135.2 Customizing	135.2-1 Entwicklung	Miller Marc	64,00	64,00	64,00	06.07.2009	09.09.2009		geplant	0,00
135.2 Customizing	135.2-2 Dokumentation	Lücking Archim	20,00	20,00	20,00	10.09.2009	14.09.2009		geplant	0,00
135.2 Customizing	135.2-3 Testen	Frenzel Thomas	8,00	8,00	8,00	09.09.2009	10.09.2009		geplant	0,00
135.3 Einführung	135.3-1 Installation/Konfiguration	Frenzel Thomas	8,00	8,00	8,00	14.09.2009	15.09.2009		geplant	0,00
135.3 Einführung	135.3-2 Schulung	Lücking Archim	16,00	16,00	16,00	15.09.2009	17.09.2009		geplant	0,00
138 Einführung Projectile	138-1 Projektleitung	Green Nicola	24,00	12,00	16,00	08.07.2009	24.07.2009		in Arbeit, verspätet	42,86
138.1 Planung	138.1-1 Konzeptgespräche	Green Nicola	16,00	-1,33	0,00	08.07.2009	09.07.2009	09.07.2009	erledigt	100,00
138.1 Planung	138.1-2 Pflichtenheft erstellen	Fisher Clara	12,00	1,00	0,00	09.07.2009	10.07.2009	13.07.2009	erledigt, verspätet	100,00

... (hier im Adobe Reader).

Im Reiter "Ergebnisse" werden die Auswertungsergebnisse verwaltet.



Projektbewertung PS0001-PA Projektbewertung

Erzeugen einer Auswertung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse

6. Ergebnisse: Hier finden Sie die Ergebnisse bereits durchgeführter Auswertungen

Max. Anzahl Ergebnisse

Ergebnisse

- <sup>[1]</sup> 04 - Arbeitspakete Plan/Ist Projektbewertung 27.07.2009 16:04:45
- <sup>[2]</sup> 04 - Arbeitspakete Plan/Ist Projektbewertung 27.07.2009 15:59:41
- <sup>[3]</sup> 04 - Arbeitspakete Plan/Ist Projektbewertung 27.07.2009 15:56:41
- <sup>[4]</sup> 04 - Arbeitspakete Plan/Ist Projektbewertung 17.07.2009 16:43:45
- <sup>[5]</sup> 04 - Arbeitspakete Plan/Ist Projektbewertung 17.07.2009 16:30:20

Anmerkungen: Die Auswertungsergebnisse werden nur dauerhaft gespeichert, wenn der Auswertungsblock abgespeichert ist. Die Anzahl der Ergebnisse kann im Feld "Max. Anzahl Ergebnisse" eingestellt werden.

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.12.1\\_bedienung\\_der\\_standardauswertungen&rev=1299681087](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.12.1_bedienung_der_standardauswertungen&rev=1299681087)

Last update: **2019/10/25 14:09**

