


[zurück Home weiter](#)

## 5.12.3 Mitarbeiter- und Kapazitätsauswertungen

Das System liefert mit Hilfe der Mitarbeiterauswertungen und Kapazitätsauswertungen Übersichten bezüglich Leistungen, Auslastung und Kapazitäten. Dazu gehören allgemeine Übersichten, Zeit- und Tätigkeitsnachweise, Plan/Ist-Vergleich, Auslastungs- und Kapazitätsauswertungen und Übersichten über Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, ...).



Im Dokument müssen zunächst wieder die Selektionskriterien der Auswertung bestimmt werden.

Im Beispiel werden alle Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung ...

... und der Betrachtungszeitraum "Letztes Quartal" ausgewählt.

Anschließend wird die Auswertung "Stundenzettel" ausgeführt.

Diese Auswertung liefert eine Übersicht über die Projektleistungen und Arbeitszeiten der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitintervall. Die Projektleistungen basieren auf den Erfassungsdaten im TimeTracker für die Arbeitspakete der Mitarbeiter. Die Arbeitszeitdaten werden im TimeTracker als "Kommen-Gehen" eingegeben oder können mit Hilfe einer Option als Summe der Projektzeiten automatisch vom System bestimmt werden. Die Abwesenheiten (Urlaub, Krank, Mutterschutz, ...) können dezentral im TimeTracker oder zentral in der Abwesenheitserfassung definiert werden.

Stundenzettel

Schaub, Peter Personalnummer 002

| Datum<br>Gesamt | Wochentag<br>Gesamt | Zeiten<br>Gesamt | Arbeitspaket/Abwesenheit<br>Gesamt | Arbeitspaket<br>Gesamt      | Plan-Arbeitszeit[h]<br>Gesamt | Ist-Arbeitszeit[h]<br>Gesamt | Differenz[h]<br>Gesamt | Bemerkung<br>Gesamt                        |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| 01.07.2009      | Mi.                 | 08:00-12:00      | 109 - Einführung Projectile        | 109-3 Einführung Projectile |                               | 4,00                         |                        | Planung, Telefonat mit externen Partnern   |
|                 |                     | 12:00-16:00      | Urlaub                             |                             |                               | 4,00                         |                        |  |
|                 |                     |                  |                                    |                             | 8,00                          | 8,00                         | 0,00                   |  |
| 02.07.2009      | Do.                 | 08:00-16:00      | Urlaub                             |                             |                               | 8,00                         |                        |  |
|                 |                     |                  |                                    |                             | 8,00                          | 8,00                         | 0,00                   |  |
| 03.07.2009      | Fr.                 | 08:00-16:00      | Urlaub                             |                             |                               | 8,00                         |                        |  |
|                 |                     |                  |                                    |                             | 8,00                          | 8,00                         | 0,00                   |  |
| 04.07.2009      | Sa.                 |                  |                                    |                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   |  |
| 05.07.2009      | So.                 |                  |                                    |                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   |  |
| 06.07.2009      | Mo.                 | 10:00-12:00      | 124 - Konzeptgespräche             | 124.1-1 Konzeptgespräche    |                               | 2,00                         |                        | SSO auf Basis von OpenLDAP                 |
|                 |                     | 12:45-19:00      | 124 - Konzeptgespräche             | 124.1-1 Konzeptgespräche    |                               | 6,25                         |                        | SSO auf Basis von OpenLDAP                 |
|                 |                     |                  |                                    |                             | 8,00                          | 8,25                         | 0,25                   |  |
| 07.07.2009      | Di.                 | 08:00-12:00      | 124 - Konzeptgespräche             | 124.1-1 Konzeptgespräche    |                               | 4,00                         |                        | SAP FI-Schnittstelle, Anpassung Reportings |
|                 |                     | 13:00-18:00      | 124 - Konzeptgespräche             | 124.1-1 Konzeptgespräche    |                               | 5,00                         |                        | SAP FI-Schnittstelle, Anpassung Reportings |
|                 |                     |                  |                                    |                             | 8,00                          | 9,00                         | 1,00                   |  |
| 08.07.2009      | Mi.                 | 08:00-14:00      | 138 - Konzeptgespräche             | 138.1-1 Konzeptgespräche    |                               | 6,00                         |                        | Schnittstellenkonzeption und Anforderungen |
|                 |                     | 15:00-18:00      | 121 - Projektleitung               | 121-1 Projektleitung        |                               | 3,00                         |                        | Projektplanung und diverse Dokumentationen |
|                 |                     |                  |                                    |                             | 8,00                          | 9,00                         | 1,00                   |  |
| 09.07.2009      | Do.                 | 08:00-11:00      | 138 - Konzeptgespräche             | 138.1-1 Konzeptgespräche    |                               | 3,00                         |                        | Dokumentation zur Schnittstellenkonzeption |

Die Auswertung "Zeitnachweise" liefert eine Übersicht über die Projektleistungen der Mitarbeiter und die Auflistung der einzelnen Tätigkeiten mit den Bemerkungen aus der Zeiterfassung. Diese Auswertung generiert eine Übersicht über die Summen- und Einzelzeitnachweise eines Mitarbeiters basierend auf der Erfassung im TimeTracker für die Arbeitspakete der Mitarbeiter. Die Auswertung wird in der Regel für interne Nachweise für das Controlling oder als externer Nachweis als Anlage zur Rechnungsstellung verwendet.

| Vorgang                         | Projekt                   | Mitarbeiter                    | Ist [h] | Ist [d] |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 140-1 Projektleitung            | 140 Einführung Projectile | 1: Smith Frank                 | 16,00   | 2,00    |
| 140.1-1 Konzeptgespräche        | 140.1 Planung             | 1: Fisher Clara 2: Smith Frank | 27,00   | 3,38    |
| 140.1-2 Pflichtenheft erstellen | 140.1 Planung             | 1: Fisher Clara                | 18,00   | 2,25    |
| 140.2-1 Entwicklung             | 140.2 Customizing         | 1: Miller Marc 2: Abel Klaus   | 16,00   | 2,00    |
|                                 |                           |                                | 77,00   | 9,63    |


  

| Datum      | Ist [h] | Projekt                   | Arbeitspaket                    | Mitarbeiter  | Bemerkung   |
|------------|---------|---------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| 01.07.2009 | 8,00    | 140 Einführung Projectile | 140-1 Projektleitung            | Smith Frank  | Kick-Off-Meeting, Projekt- und Ressourcenplanung    |
| 02.07.2009 | 8,00    | 140.1 Planung             | 140.1-1 Konzeptgespräche        | Fisher Clara | Einführungsplanung, Koordination der Partnerfirmen  |
| 02.07.2009 | 8,00    | 140.1 Planung             | 140.1-1 Konzeptgespräche        | Smith Frank  | Basisversion und Reports                            |
| 03.07.2009 | 4,00    | 140.1 Planung             | 140.1-1 Konzeptgespräche        | Fisher Clara | Fibu- und LDAP-Schnittstelle                        |
| 03.07.2009 | 4,00    | 140.1 Planung             | 140.1-1 Konzeptgespräche        | Smith Frank  | Schnittstellenszenarien                             |
| 06.07.2009 | 3,00    | 140.1 Planung             | 140.1-1 Konzeptgespräche        | Fisher Clara | Schnittstellenkonzepte, Schulungen                  |
| 06.07.2009 | 5,00    | 140.1 Planung             | 140.1-2 Pflichtenheft erstellen | Fisher Clara | Basisversion und Reports                            |
| 08.07.2009 | 4,00    | 140 Einführung Projectile | 140-1 Projektleitung            | Smith Frank  | Status-Meeting, Projektreporting, Dokumentation     |
| 08.07.2009 | 8,00    | 140.1 Planung             | 140.1-2 Pflichtenheft erstellen | Fisher Clara | Schnittstellen (Fibu, LDAP, MS Project)             |
| 16.07.2009 | 5,00    | 140.1 Planung             | 140.1-2 Pflichtenheft erstellen | Fisher Clara | Fibu-Schnittstelle, Änderungen Dokumentenmanagement |


Die Auswertung "Projektzeit Extern/Intern" liefert eine Übersicht über alle relevanten Arbeitszeitdaten der Mitarbeiter im ausgewählten Zeitintervall. Zusätzlich zu diesen Informationen werden auch Informationen aus der Leistungsbewertung, der Abrechnung und der Reisekostenerfassung aufgelistet.

| Mitarbeiter    | Soil-AZ  | Ist-AZ extern | Ist-AZ intern | Urlaub | Differenz | Urlaubsanspruch | Krank | Fakturierbar | Fakturiert | Ist-AZ | Ist-Umsatz | Ist-Kosten | Reisekosten |
|----------------|----------|---------------|---------------|--------|-----------|-----------------|-------|--------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| Fisher Clara   | 184,00   | 119,00        | 0,00          | 80,00  | 15,00     | 18,00           | 0,00  | 119,00       | 0,00       | 199,00 | 0,00       | 5.900,00   | 0,00        |
| Frenzel Thomas | 184,00   | 6,00          | 0,00          | 64,00  | -114,00   | 20,00           | 0,00  | 6,00         | 0,00       | 70,00  | 0,00       | 5.490,00   | 0,00        |
| Green Nicola   | 184,00   | 20,33         | 0,00          | 0,00   | -155,67   | 0,00            | 8,00  | 20,33        | 0,00       | 28,33  | 1.200,00   | 1.820,00   | 0,00        |
| Lücking Archim | 184,00   | 0,00          | 0,00          | 80,00  | -104,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 80,00  | 9.645,00   | 3.015,00   | 0,00        |
| Schaub Peter   | 184,00   | 145,75        | 0,00          | 44,00  | 13,75     | 4,50            | 8,00  | 145,75       | 0,00       | 197,75 | 31.027,50  | 23.874,06  | 877,00      |
| Smith Frank    | 184,00   | 28,00         | 0,00          | 0,00   | -108,00   | 0,00            | 48,00 | 28,00        | 0,00       | 76,00  | 0,00       | 4.620,00   | 0,00        |
|                | 1.104,00 | 319,08        | 0,00          | 268,00 | -452,92   | 42,50           | 64,00 | 319,08       | 0,00       | 651,08 | 41.872,50  | 254.719,06 | 877,00      |

Die Auswertung "Auslastungsübersicht II" generiert mitarbeiterbezogen eine Übersicht über alle Aufgaben der Mitarbeiter und ordnet diese gemäß ihrer Planzeiträume an. Diese Auswertung enthält Hinweise, wenn Aufgaben aufgrund fehlender Kapazitäten nicht rechtzeitig beendet werden können.

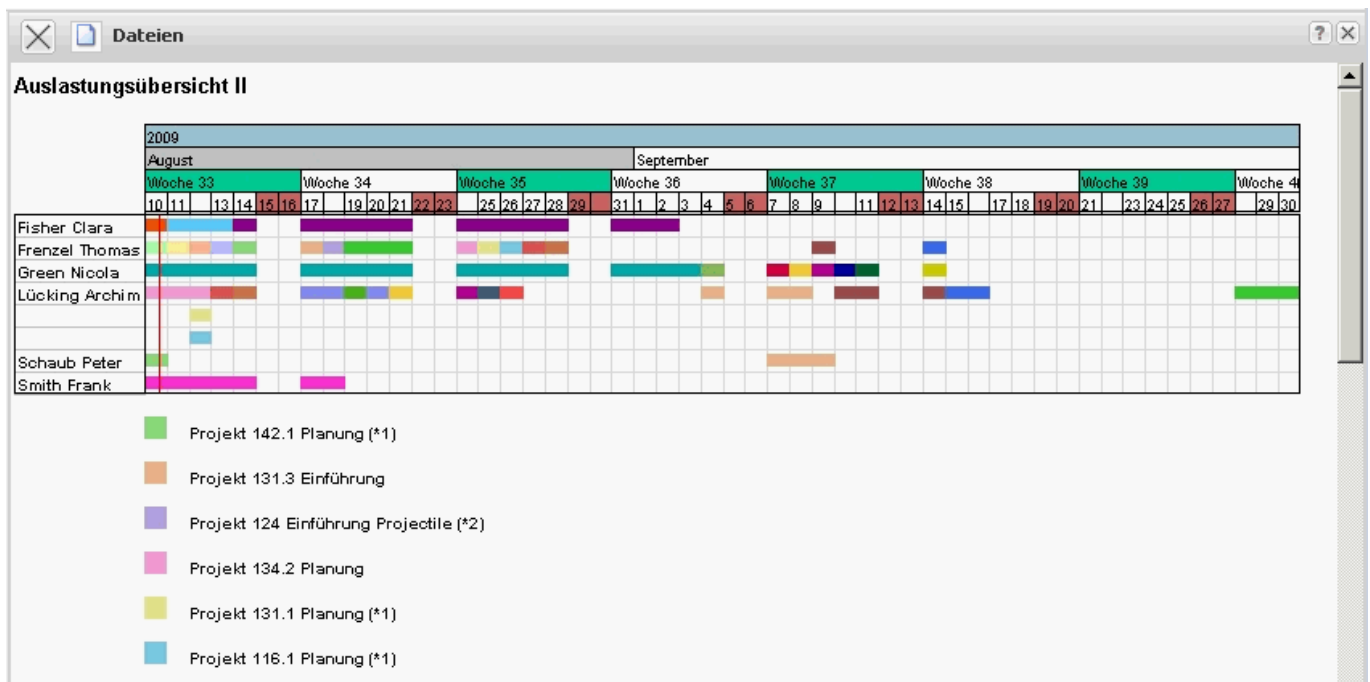

Die Auswertung "Auslastungsübersicht III" generiert mitarbeiterbezogen eine Übersicht über alle Aufgaben der Mitarbeiter und ordnet diese gemäß ihrer Planzeiträume an. In der ersten Zeile der Mitarbeiter sind dabei die Auslastungen der Mitarbeiter in drei Kategorien (rot - überlastet, gelb - ausgelastet und grün - normale Auslastung) dargestellt. Die Schwellwerte können vom Benutzer (obere Auslastungsgrenze und untere Auslastungsgrenze) eingestellt werden. Darüber hinaus enthält die erste Zeile pro Mitarbeiter auch die geplanten Abwesenheiten (im Beispiel Urlaub). In den Zeilen unter dem Mitarbeiternamen sind alle Arbeitspakete des Mitarbeiters dargestellt, um bei Überlastung die Ressourcenkonflikte auflösen zu können.

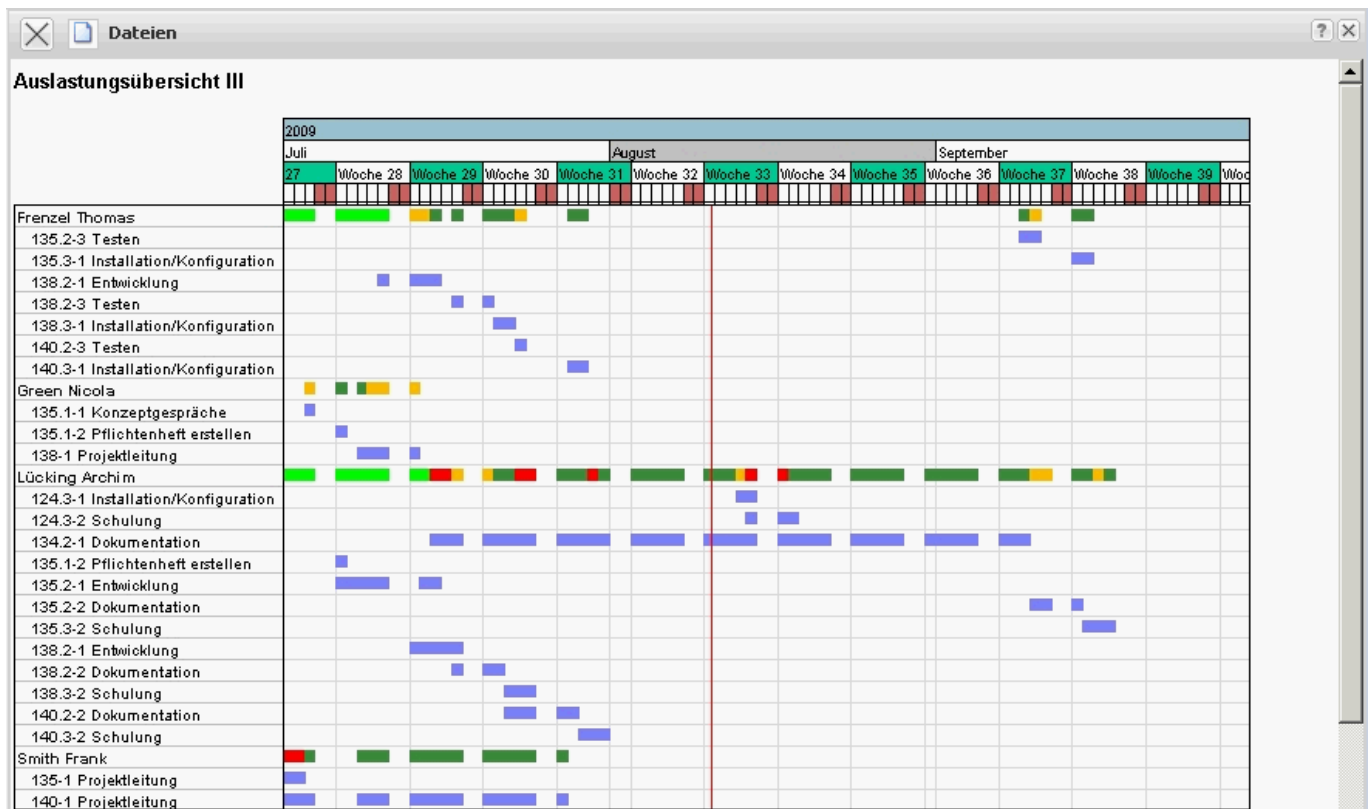


- Überlastet ( >100.0 % )
- Ausgelastet ( >80.0 % )
- Normal
- Urlaub
- Termine zum Arbeitspaket

Die "Kapazitätenauswertung II" generiert mitarbeiterbezogen eine Übersicht über alle geplanten Aufgaben der Mitarbeiter für beliebige Perioden im Betrachtungszeitraum. In der tabellarischen Darstellung werden hier die geplanten prozentualen Projektzeiten der Mitarbeiter über die Perioden aufgelistet. Die Perioden können vom Benutzer im Reiter "Parameter" ausgewählt werden (Voreinstellung wöchentlich).

**Kapazitätenauswertung II: 20.07.2009 - 07.09.2009**

(Alle Werte in %)

| Mitarbeiter    | Projekt                 | KW 30  | KW 31  | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | 7.9.2009 - 8.9.2009 |
|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Fisher Clara   | Abwesenheiten           | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | Summe                   | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| Frenzel Thomas | 138.2 Customizing aktiv | 5,75   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | 138.3 Einführung passiv | 20,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | 140.2 Customizing aktiv | 20,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | 140.3 Einführung aktiv  | 0,00   | 20,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | Summe                   | 45,75  | 20,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| Green Nicola   | Summe                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| Lücking Archim | 124.3 Einführung aktiv  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 36,61 | 23,39 | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | 134.2 Planung passiv    | 6,17   | 6,17   | 6,17  | 6,17  | 6,17  | 6,17  | 6,17  | 6,17                |
|                | 138.2 Customizing aktiv | 28,60  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | 138.3 Einführung passiv | 40,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | 140.2 Customizing aktiv | 37,17  | 22,83  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | 140.3 Einführung aktiv  | 0,00   | 40,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
|                | Summe                   | 111,94 | 69,01  | 6,17  | 42,79 | 29,56 | 6,17  | 6,17  | 6,17                |

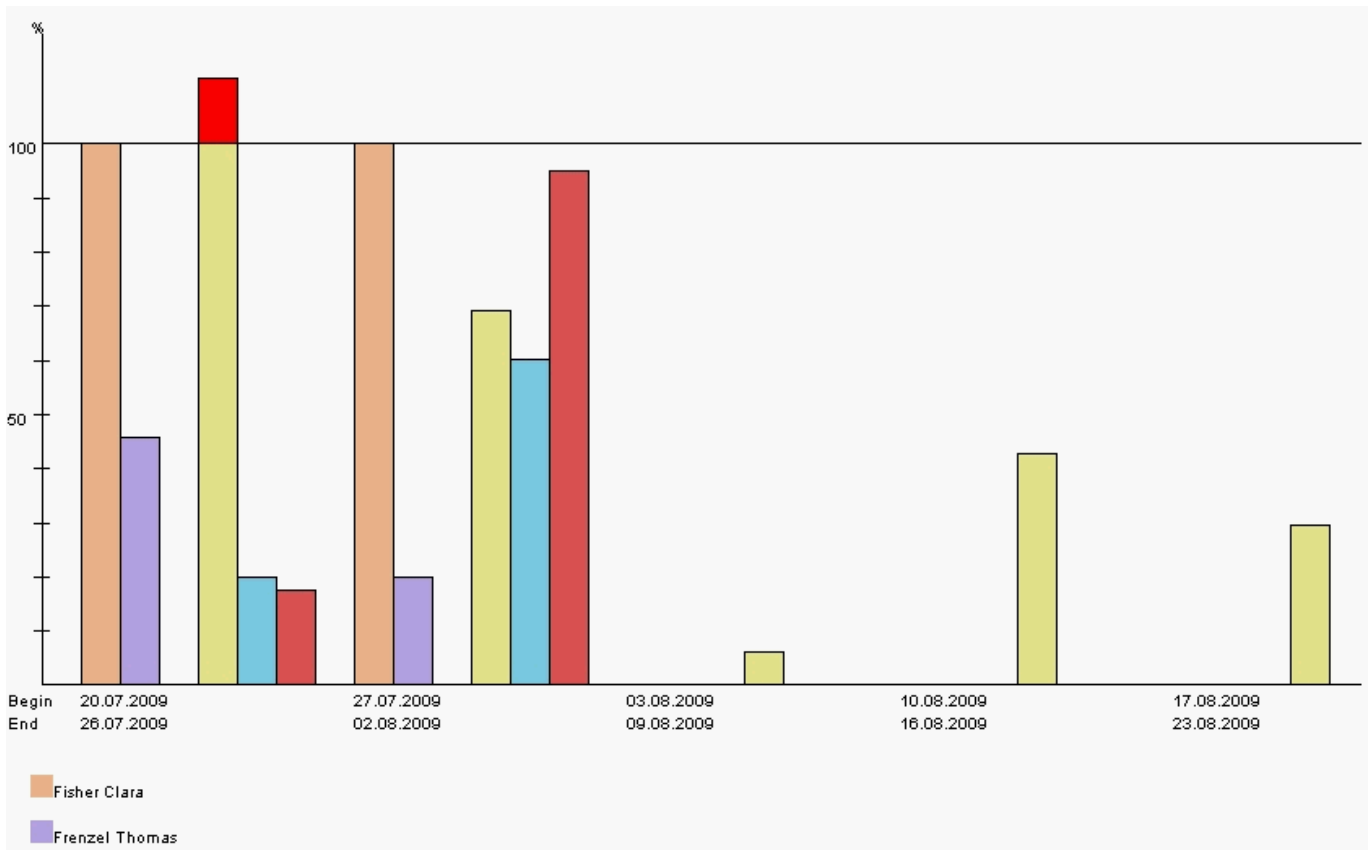


Die "Kapazitätenauswertung III" generiert mitarbeiterbezogen eine Übersicht über alle geplanten Aufgaben der Mitarbeiter für beliebige Perioden im Betrachtungszeitraum. In der tabellarischen Darstellung werden hier die geplanten absoluten Projektzeiten der Mitarbeiter über die Perioden aufgelistet. Die Aufwände werden vom System mit den jeweiligen internen Stundensätzen multipliziert und ergeben die geplanten Kosten pro Periode, die geplanten Aufwände mit den externen Stundensätzen ergeben die Erlöse. Die Perioden können vom Benutzer im Reiter "Parameter" ausgewählt werden (Voreinstellung wöchentlich).

| Mitarbeiter                 | Projekt                   | Arbeitspaket                       | KW 31 Stunden | KW 31 Kostensatz | KW 31 Externer Satz | KW 31 Kosten | KW 31 Erlöse | KW 32 Stunden | KW 32 Kostensatz | KW 32 Externer Satz | KW 32 Kosten | KW 32 Erlöse |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Fisher Clara: Abwesenheiten |                           |                                    | 40,00         |                  |                     |              |              | 0,00          |                  |                     |              |              |
| Frenzel Thomas              | 140.3 Einführung          | 140.3-1 Installation/Konfiguration | 8,00          | 90,00            | 125,00              | 720,00       | 1.000,00     | 0,00          | 90,00            | 125,00              | 0,00         | 0,00         |
| Lücking Archim              | 134.2 Planung             | 134.2-1 Dokumentation              | 2,47          | 60,00            | 0,00                | 148,15       | 0,00         | 2,96          | 60,00            | 0,00                | 177,78       | 0,00         |
| Lücking Archim              | 140.2 Customizing         | 140.2-2 Dokumentation              | 9,13          | 60,00            | 90,00               | 548,03       | 822,04       | 0,00          | 60,00            | 90,00               | 0,00         | 0,00         |
| Lücking Archim              | 140.3 Einführung          | 140.3-2 Schulung                   | 16,00         | 60,00            | 120,00              | 960,00       | 1.920,00     | 0,00          | 60,00            | 120,00              | 0,00         | 0,00         |
| Schaub Peter: Abwesenheiten |                           |                                    | 24,00         |                  |                     |              |              | 0,00          |                  |                     |              |              |
| Smith Frank                 | 140 Einführung Projectile | 140-1 Projektleitung               | 6,00          | 60,00            | 120,00              | 360,00       | 720,00       | 0,00          | 60,00            | 120,00              | 0,00         | 0,00         |
| Smith Frank: Abwesenheiten  |                           |                                    | 32,00         |                  |                     |              |              | 0,00          |                  |                     |              |              |
|                             |                           |                                    | 137,60        |                  |                     | 2.736,18     | 4.462,04     | 2,96          |                  |                     | 177,78       | 0,00         |

Die "Kalenderübersicht II" generiert eine Übersicht über die An- und Abwesenheiten der ausgewählten Mitarbeiter im Betrachtungszeitraum. Diese Variante zeigt dabei die Abwesenheiten nur in allgemeiner Form an und unterscheidet nicht in Abwesenheitsarten.



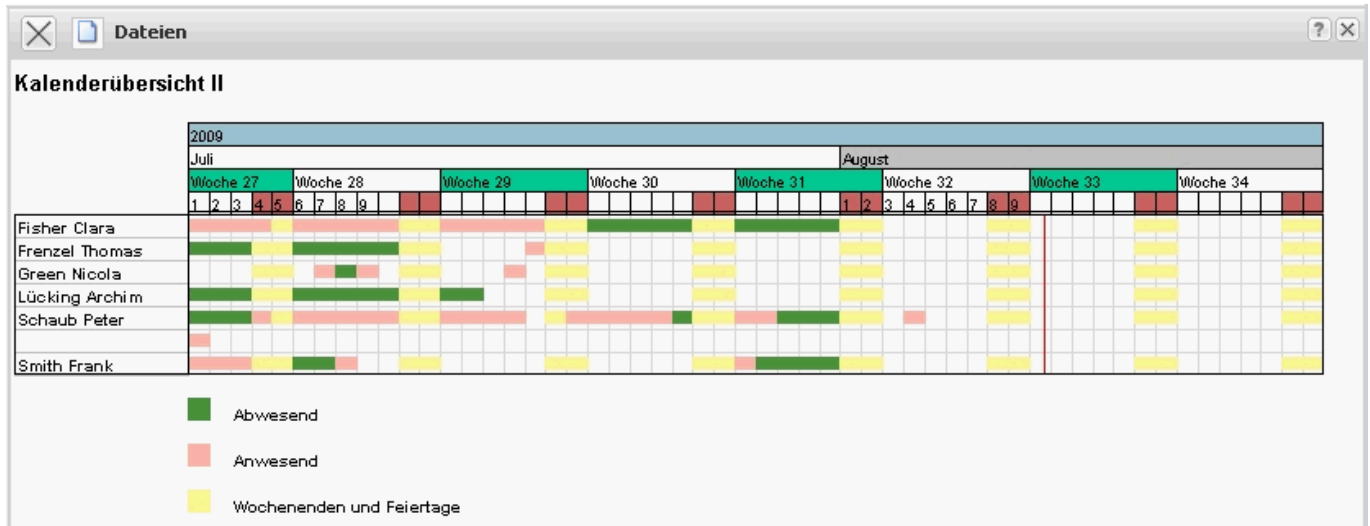

... Fortsetzung

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: [https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.12.3\\_mitarbeiter-\\_und\\_kapazitaetsauswertungen&rev=1249918714](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.12.3_mitarbeiter-_und_kapazitaetsauswertungen&rev=1249918714)

Last update: 2019/10/25 14:10

