zurück Home weiter

3.05 Kalkulation, Angebote, Auf-träge und Projektfreigabe

5.2 Angebotsverwaltung

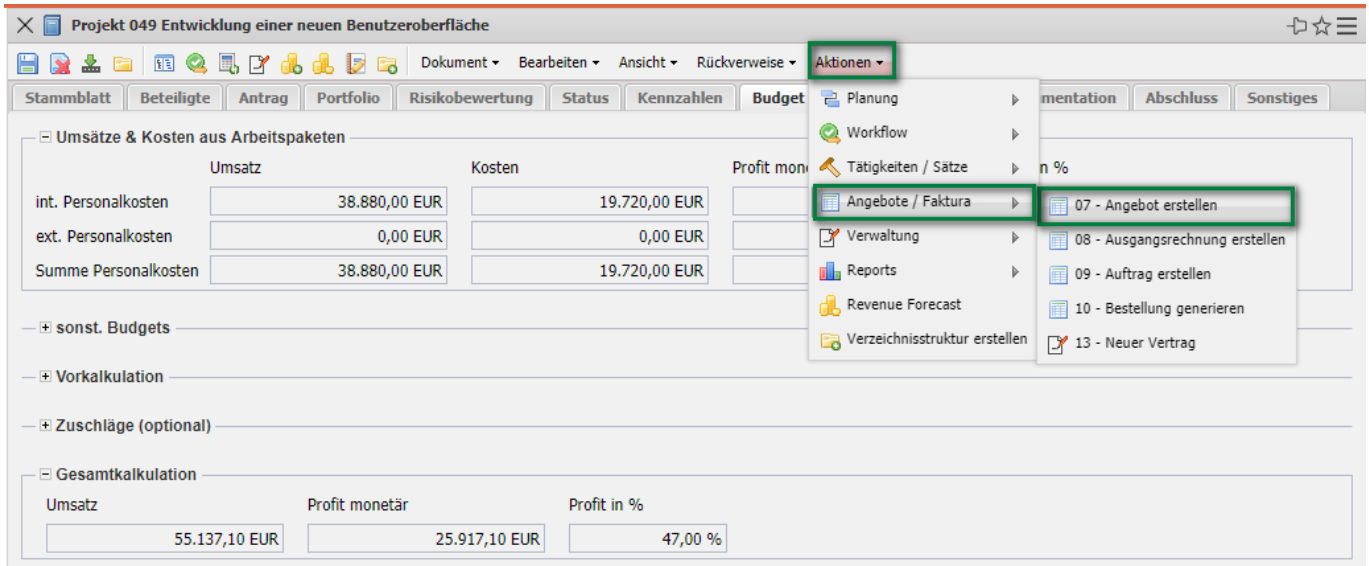

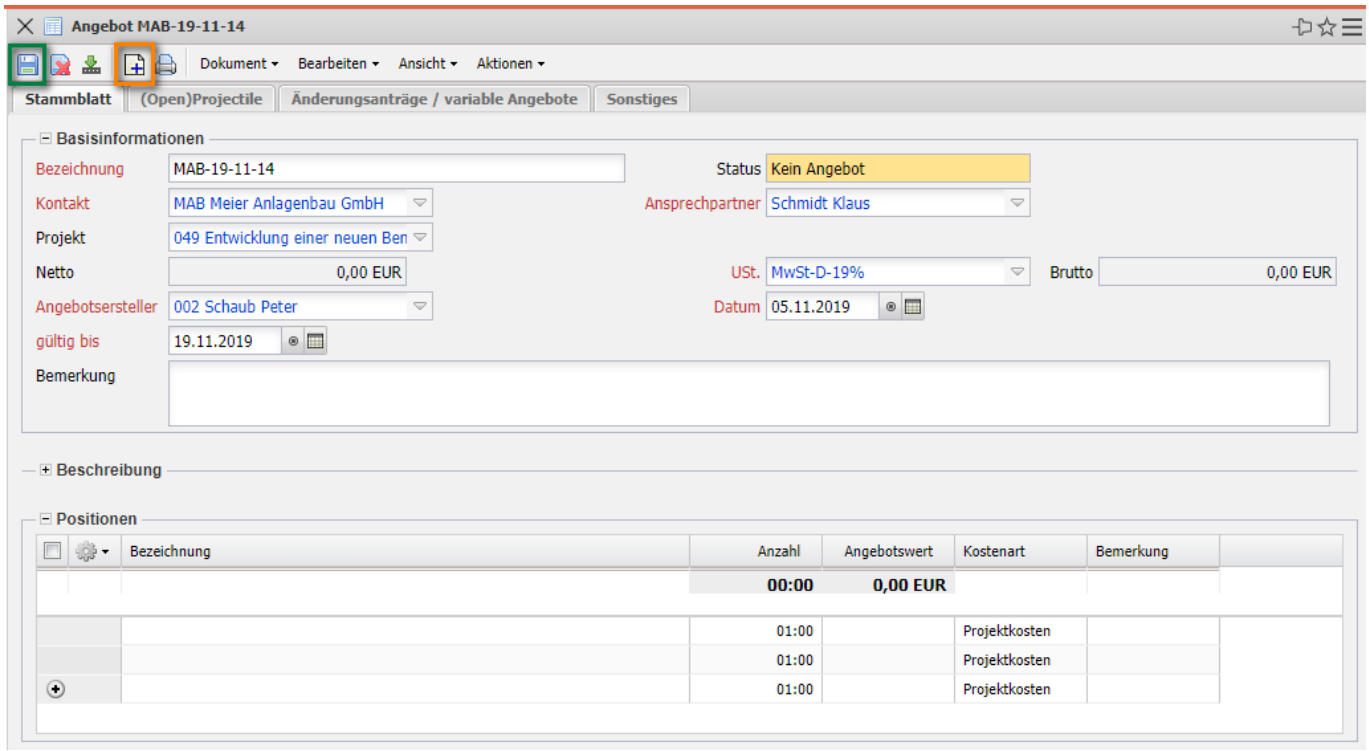

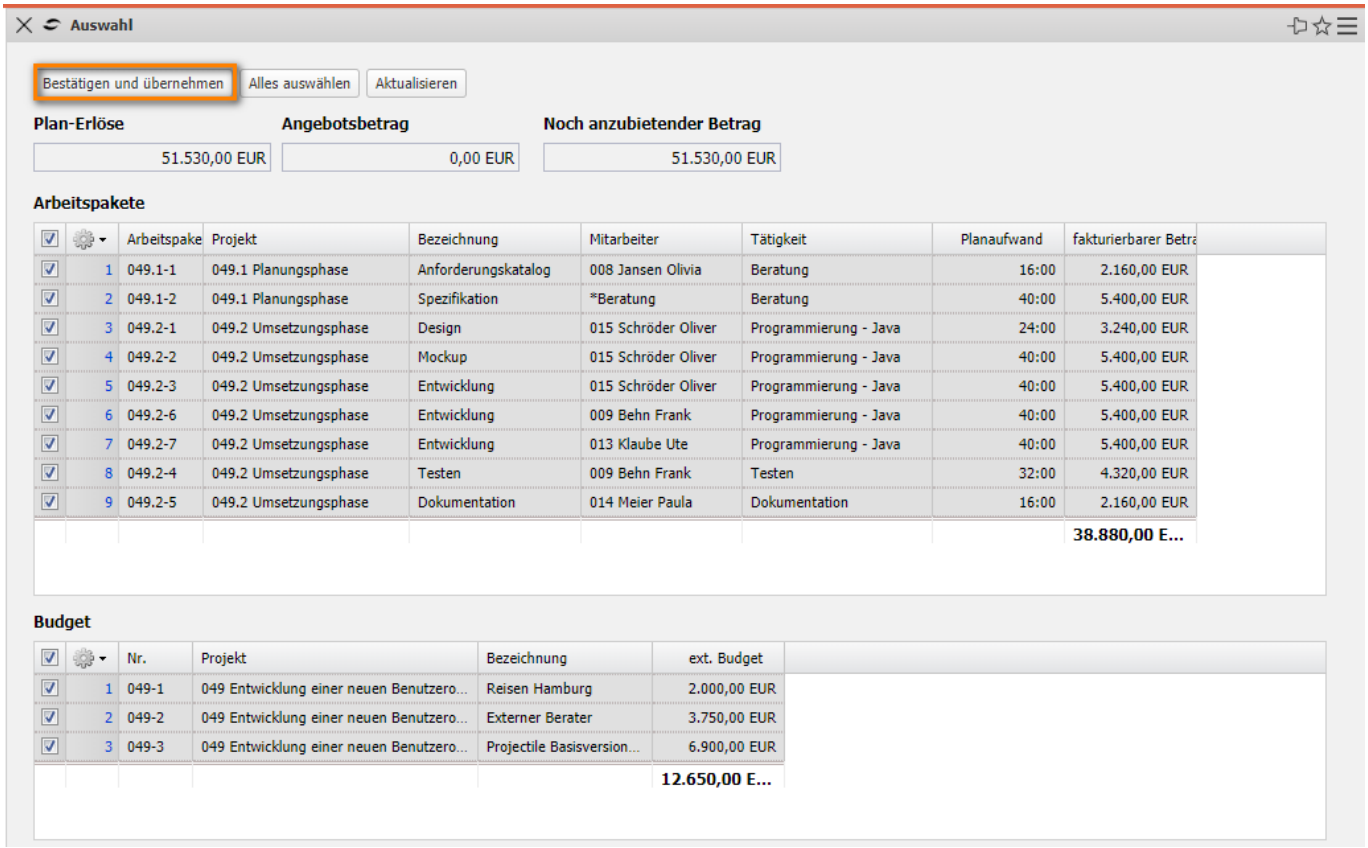
Auswahl
Bestätigen und übernehmen
Alles auswählen
Aktualisieren
Plan-Erlöse
51.530,00 EUR
Angebotsbetrag
0,00 EUR
Noch anzubietender Betrag
51.530,00 EUR
Arbeitspakete
Arbeitspake Projekt Bezeichnung Mitarbeiter Tätigkeit Planaufwand fakturierbarer Betra
1 049.1-1 049.1 Planungsphase Anforderungskatalog 008 Jansen Olivia Beratung 16:00 2.160,00 EUR
2 049.1-2 049.1 Planungsphase Spezifikation *Beratung Beratung 40:00 5.400,00 EUR
3 049.2-1 049.2 Umsetzungsphase Design 015 Schröder Oliver Programmierung - Java 24:00 3.240,00 EUR
4 049.2-2 049.2 Umsetzungsphase Mockup 015 Schröder Oliver Programmierung - Java 40:00 5.400,00 EUR
5 049.2-3 049.2 Umsetzungsphase Entwicklung 015 Schröder Oliver Programmierung - Java 40:00 5.400,00 EUR
6 049.2-6 049.2 Umsetzungsphase Entwicklung 009 Behn Frank Programmierung - Java 40:00 5.400,00 EUR
7 049.2-7 049.2 Umsetzungsphase Entwicklung 013 Klaube Ute Programmierung - Java 40:00 5.400,00 EUR
8 049.2-4 049.2 Umsetzungsphase Testen 009 Behn Frank Testen 32:00 4.320,00 EUR
9 049.2-5 049.2 Umsetzungsphase Dokumentation 014 Meier Paula Dokumentation 16:00 2.160,00 EUR
38.880,00 E...
Budget
Nr. Projekt Bezeichnung ext. Budget
1 049-1 049 Entwicklung einer neuen Benutzero... Reisen Hamburg 2.000,00 EUR
2 049-2 049 Entwicklung einer neuen Benutzero... Externer Berater 3.750,00 EUR
3 049-3 049 Entwicklung einer neuen Benutzero... Projectile Basisversion... 6.900,00 EUR
12.650,00 E...

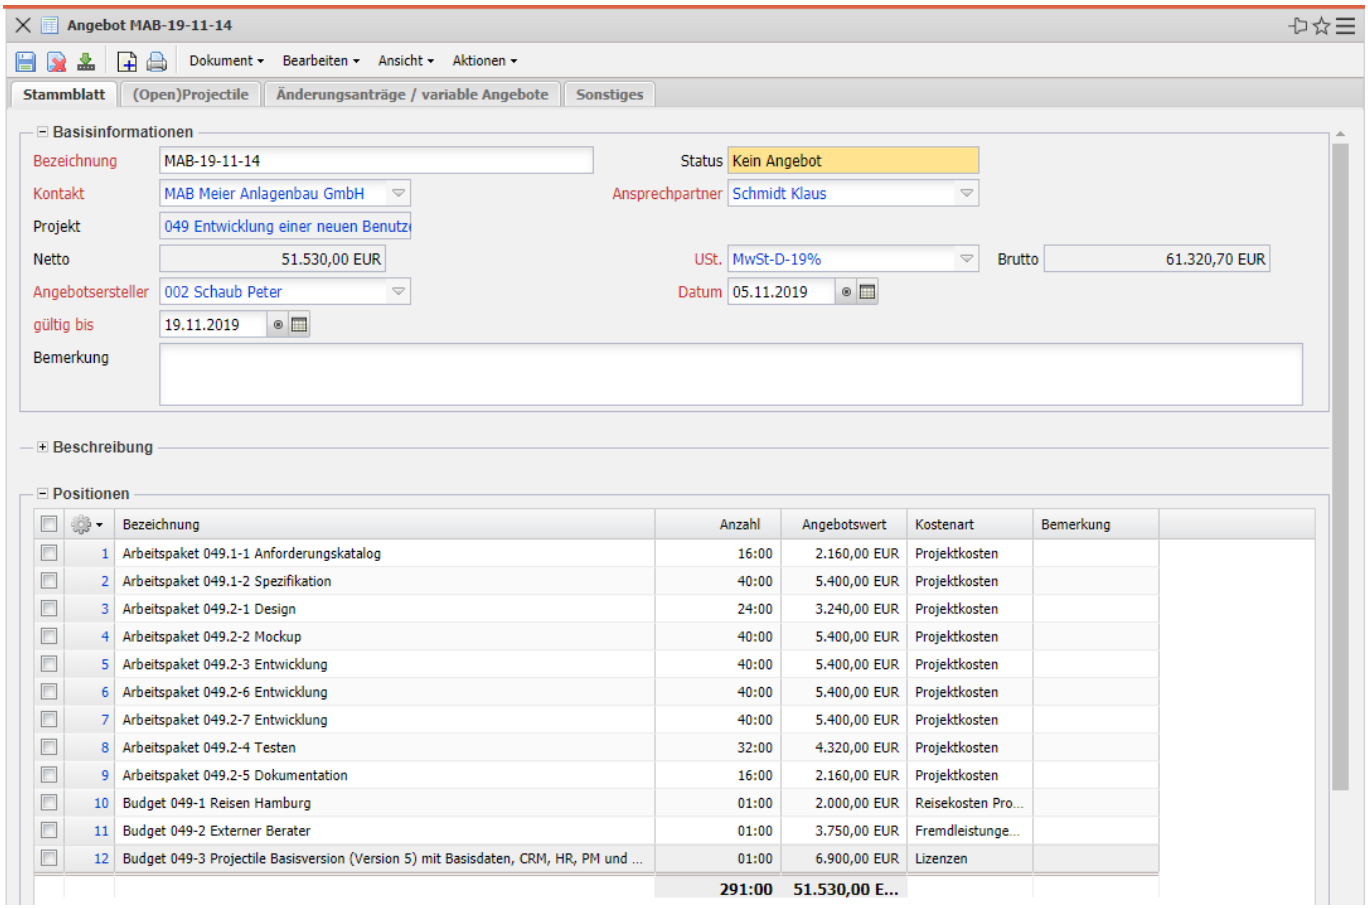
Angebot MAB-19-11-14
Dokument
Bearbeiten
Ansicht
Aktionen
Stammblatt
(Open)Projectile
Änderungsanträge / variable Angebote
Sonstiges
Basisinformationen
Bezeichnung MAB-19-11-14
Status Kein Angebot
Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH
Ansprechpartner Schmidt Klaus
Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz
Netto 51.530,00 EUR
USt. MwSt-D-19%
Brutto 61.320,70 EUR
Angebotsersteller 002 Schaub Peter
Datum 05.11.2019
gültig bis 19.11.2019
Bemerkung
Beschreibung
Positionen
Bezeichnung Anzahl Angebotswert Kostenart Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog 16:00 2.160,00 EUR Projektkosten
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation 40:00 5.400,00 EUR Projektkosten
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design 24:00 3.240,00 EUR Projektkosten
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup 40:00 5.400,00 EUR Projektkosten
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung 40:00 5.400,00 EUR Projektkosten
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung 40:00 5.400,00 EUR Projektkosten
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung 40:00 5.400,00 EUR Projektkosten
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen 32:00 4.320,00 EUR Projektkosten
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation 16:00 2.160,00 EUR Projektkosten
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg 01:00 2.000,00 EUR Reisekosten Pro...
11 Budget 049-2 Externer Berater 01:00 3.750,00 EUR Fremdleistunge...
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ... 01:00 6.900,00 EUR Lizenzen
291:00 51.530,00 E...

Positionen

	Bezeichnung	Anzahl	Angebotswert	Kostenart	Bemerkung
1	Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	
2	Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
3	Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten	
4	Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
5	Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
6	Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
7	Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
8	Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	Projektkosten	
9	Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	Projektkosten	
10	Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11	Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	Fremdleistunge...	
12	Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	
		323:00	56.090,00 E...		

Angebot MAB-19-11-14

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt (Open)Projectile Änderungsanträge / variable Angebote Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung MAB-19-11-14 Status Kein Angebot

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Ansprechpartner Schmidt Klaus

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 56.090,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 66.747,10 EUR

Angebotsersteller 002 Schaub Peter Datum 05.11.2019

gültig bis 19.11.2019

Bemerkung

Beschreibung

Positionen

	Bezeichnung	Anzahl	Angebotswert	Kostenart	Bemerkung
1	Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	
2	Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
3	Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten	
4	Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
5	Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
6	Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	56:00	7.560,00 EUR	Projektkosten	
7	Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	
8	Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	Projektkosten	
9	Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	Projektkosten	
10	Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11	Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	Fremdleistunge...	
12	Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	
		323:00	56.090,00 E...		

Angebot MAB-19-11-14

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt (Open)Projectile Änderungsanträge / variable Angebote Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung MAB-19-11-14 Status Angebot fertiggestellt

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Ansprechpartner Schmidt Klaus

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 56.090,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 66.747,10 EUR

Angebotsersteller 002 Schaub Peter Datum 05.11.2019

gültig bis 19.11.2019

Bemerkung

Beschreibung

Positionen

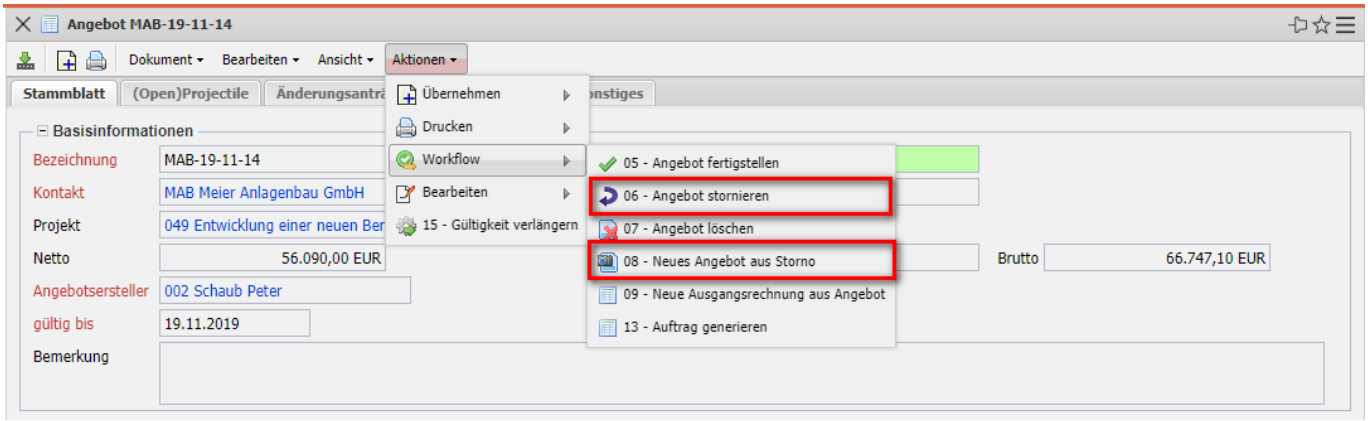

... Fortsetzung]]

From:
https://infodesire.net/dokuwiki/ - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche_fortsetzung

Last update: **2020/01/17 14:45**
