zurück Home weiter

2.06.07 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog “Fertigstellung schätzen” (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Die Maske Fertigstellung schätzen kann in der oberen Menüleiste ...

... oder in der linken Menüleiste geöffnet werden.

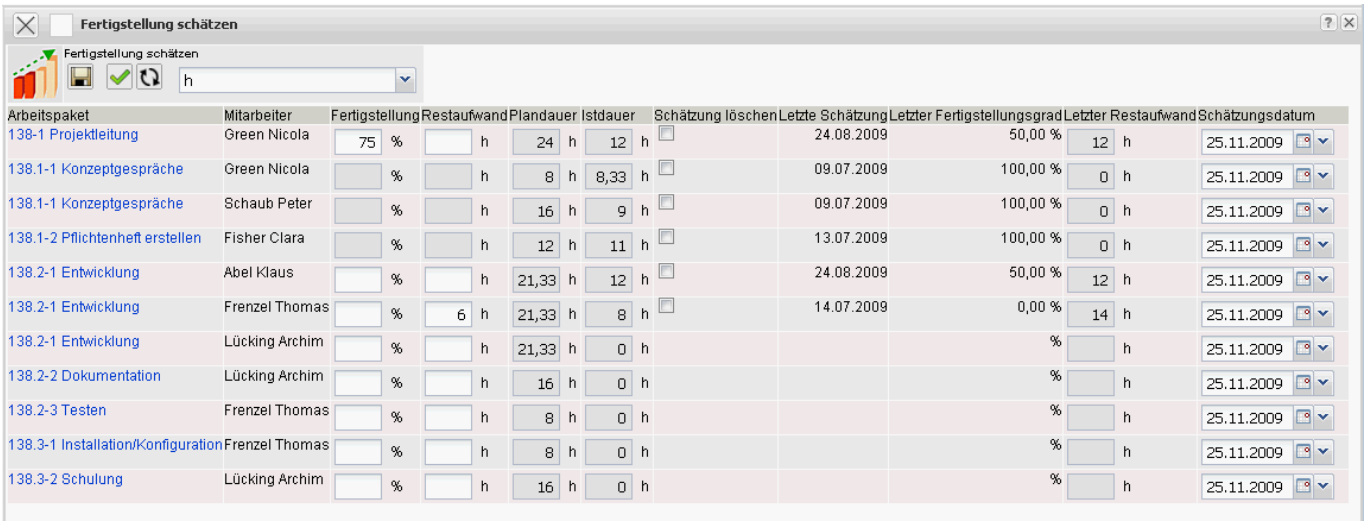

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Plandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum
138-1 Projektleitung	Green Nicola	75 %	h	24 h	12 h		24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009
138.1-1 Konzeptgespräche	Green Nicola	%	h	8 h	8,33 h		09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009
138.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	%	h	16 h	9 h		09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009
138.1-2 Pflichtenheft erstellen	Fisher Clara	%	h	12 h	11 h		13.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009
138.2-1 Entwicklung	Abel Klaus	%	h	21,33 h	12 h		24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009
138.2-1 Entwicklung	Frenzel Thomas	%	6 h	21,33 h	8 h		14.07.2009	0,00 %	14 h	25.11.2009
138.2-1 Entwicklung	Lücking Archim	%	h	21,33 h	0 h			%	h	25.11.2009
138.2-2 Dokumentation	Lücking Archim	%	h	16 h	0 h			%	h	25.11.2009
138.2-3 Testen	Frenzel Thomas	%	h	8 h	0 h			%	h	25.11.2009
138.3-1 Installation/Konfiguration	Frenzel Thomas	%	h	8 h	0 h			%	h	25.11.2009
138.3-2 Schulung	Lücking Archim	%	h	16 h	0 h			%	h	25.11.2009

From:
https://infodesire.net/dokuwiki/ - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1285317459

Last update: **2019/10/25 14:10**
