

[zurück Home weiter](#)

## 4.2.07 Schätzungen

### Fertigstellung

Die **Fertigstellung** kennzeichnet den qualitativen Projektfortschritt. Diese Kennzahl macht die Einschätzung des Projektablaufes transparenter und wird für den Projektstatus herangezogen. Diese Information wird in den Projektauswertungen tabellarisch und graphisch dargestellt.

Beim Neuanlegen für den Fertigstellungsgrad eines Projektes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Projekt:** Dieses Feld wird aus dem Projektdokument automatisch übernommen.
- **Berichtsdatum:** Das Berichtsdatum für den Fertigstellungsgrad wird mit dem aktuellen Datum belegt.
- **Mitarbeiter:** Das Feld Anlage kennzeichnet den Bearbeiter des Datensatzes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.

The screenshot shows a software window titled "Fertigstellung DS09-A 75,00". The interface includes a menu bar with "Dokument", "Bearbeiten", and "Ansicht". Below the menu is a tabbed interface with "Stammblatt", "Sonstiges", and "Alle". The "Stammblatt" tab is active. The form contains the following fields:

- Nummer:** DS09-A
- Projekt:** DS09 Einführung Risikomanagement
- Berichtsdatum:** 19.04.2006
- Fertigstellung:** 75 %
- Mitarbeiter:** Schaub Peter
- Bemerkung:** (Empty text area)

**Mussfelder:** Fertigstellung

### Schätzung von Fertigstellungsgraden

Die Fertigstellung wird direkt aus den Projekten bzw. Unterprojekten definiert. Im folgenden Beispiel wird eine Schätzung für das Hauptprojekt definiert. Mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Feld Fertigstellung ...

**Projekt 1 Einführung Projectile**

01 - Projekt aktivieren

Stammblatt | Finanzen | Sonstiges | Alle

Projekt: 1

Bezeichnung: Einführung Projectile

Oberprojekt:

Unterprojekte:

[1] 1.1 Planung [2] 1.2 Realisierung [3] 1.3 Testen

Externer Auftrag: ☒

Auftraggeber: 1 CONSULT GmbH

Ansprechpartner: 1.1 Lisa Nahl

Projektmanager:

☐ Testmitarbeiter

Projektteam:

[1] Müller Julia [2] Schmidt Frank [3] Testmitarbeiter  
[4] Schröder Sandra [5] Meier Dieter

Projektzeitraum: von 23.05.2002 bis 01.07.2002

Plan-Aufwand: 176:00 h 22 Pt

Status: abgeschlossen

Unit: Abteilung 1

Priorität: 3 - normale Priorität

Arbeitspakete:

☐ 1-1 Projektleitung

Meilensteine:

[1] 1-A Konzeptabnahme 30.05.2002 [2] 1-B Prototyp 24.06.2002 [3] 1-C Testbetrieb 29.06.2002

Fertigstellung:

Fixiert: ☐ Neues Dokument

... wird ein neues Dokument mit den oben genannten Vorbelegungen erzeugt.

**Fertigstellung 1-A**

Nummer: 1-A

Projekt: Projekt 1 Einführung Projectile


Berichtsdatum: 03.06.2002

Fertigstellung: %

Mitarbeiter: Schmidt Frank

Bemerkung:

Nach der Eingabe der Daten für die Schätzung (Fertigstellung, Bezeichnung) wird die Schätzung abgespeichert.

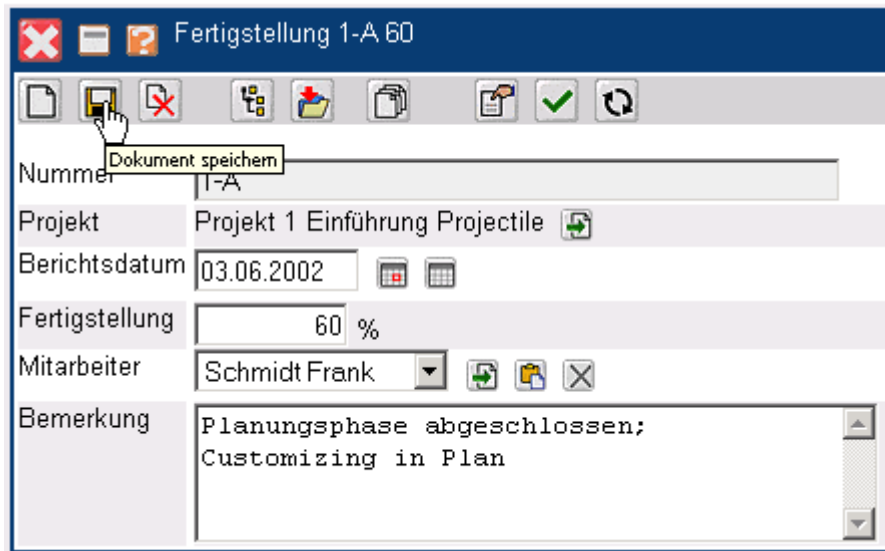

Fertigstellung 1-A 60

Nummer: 1-A

Projekt: Projekt 1 Einführung Projectile

Berichtsdatum: 03.06.2002

Fertigstellung: 60 %

Mitarbeiter: Schmidt Frank

Bemerkung: Planungsphase abgeschlossen;  
Customizing in Plan

Diese Schätzungen können periodisch analog vorgenommen werden.

Die Schätzung für den Fertigstellungsgrad können im TimeTracker auf Arbeitspaketebene definiert werden.

## Trendtermin

Die Trendtermine ermöglichen die Schätzung des voraussichtlichen Termins, zu dem ein **Meilenstein** erreicht sein wird. Durch diese Schätzungen wird die Datenbasis für die **Meilenstein-Trend-Analyse** gelegt.

Beim Neuanlegen einer Terminschätzung werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Meilenstein:** Dieses Feld wird aus dem Meilenstein-Dokument automatisch übernommen.
- **Berichtsdatum:** Das Berichtsdatum für den Trendtermin wird mit dem aktuellen Datum belegt.
- **Mitarbeiter:** Das Feld Anlage kennzeichnet den Bearbeiter des Datensatzes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.


**Mussfelder:** Trenddatum

**Besonderheiten:**

- Die Trendtermine werden in der Meilenstein-Trend-Analyse in der [Projektauswertung](#) zur Verfügung gestellt.

## Schätzung von Trendterminen

Die Trendtermine werden direkt aus den Meilensteinen definiert. Mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Feld Trendtermine ...

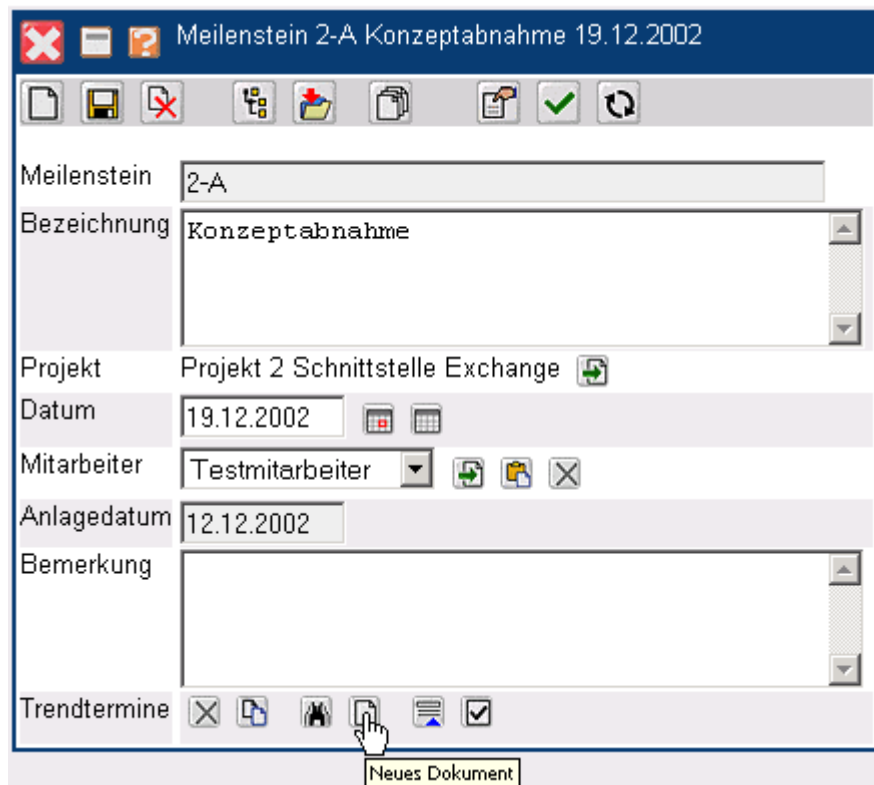

Meilenstein 2-A

Bezeichnung Konzeptabnahme

Projekt Projekt 2 Schnittstelle Exchange

Datum 19.12.2002

Mitarbeiter Testmitarbeiter


Anlagendatum 12.12.2002

Bemerkung

Trendtermine

Neues Dokument

... wird eine neues Dokument mit den oben genannten Vorbelegungen erzeugt. Nach Eingabe der Daten für den Trendtermin wird das Dokument abgespeichert.

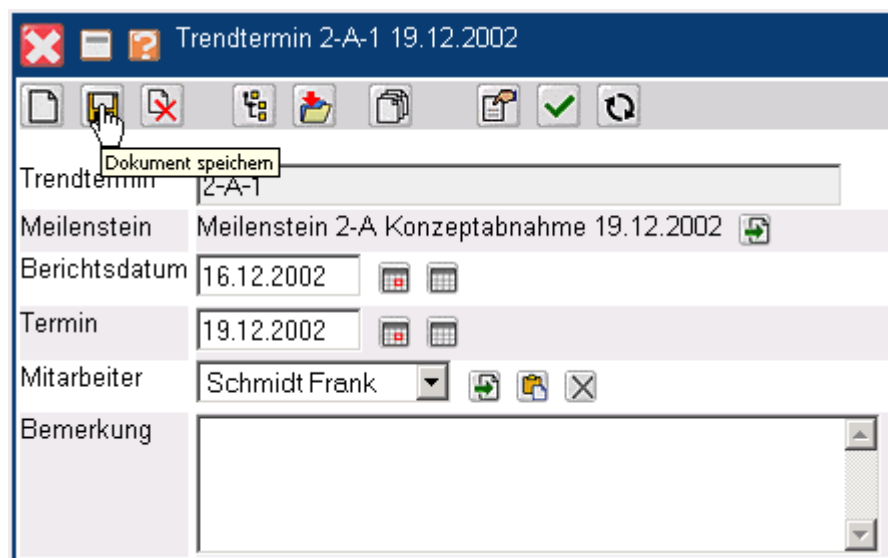

Trendtermin 2-A-1

Meilenstein Meilenstein 2-A Konzeptabnahme 19.12.2002

Berichtsdatum 16.12.2002

Termin 19.12.2002

Mitarbeiter Schmidt Frank

Bemerkung

Dokument speichern

Nach dem Speichern werden alle Trendtermine in das entsprechende Dokument übernommen.

Meilenstein 2-A Konzeptabnahme 19.12.2002

Meilenstein: 2-A

Bezeichnung: Konzeptabnahme

Projekt: Projekt 2 Schnittstelle Exchange

Datum: 19.12.2002

Mitarbeiter: Testmitarbeiter

Anlagedatum: 12.12.2002

Bemerkung:


Trendtermine:

- ☐ 2-A-1 19.12.2002

Das folgende Diagramm zeigt die im Beispiel definierten Schätzungen in der Meilenstein-Trend-Analyse:

Projektauswertung 05 - Meilenstein-Trend-Analyse

## Projektauswertung 05 - Meilenstein-Trend-Analyse

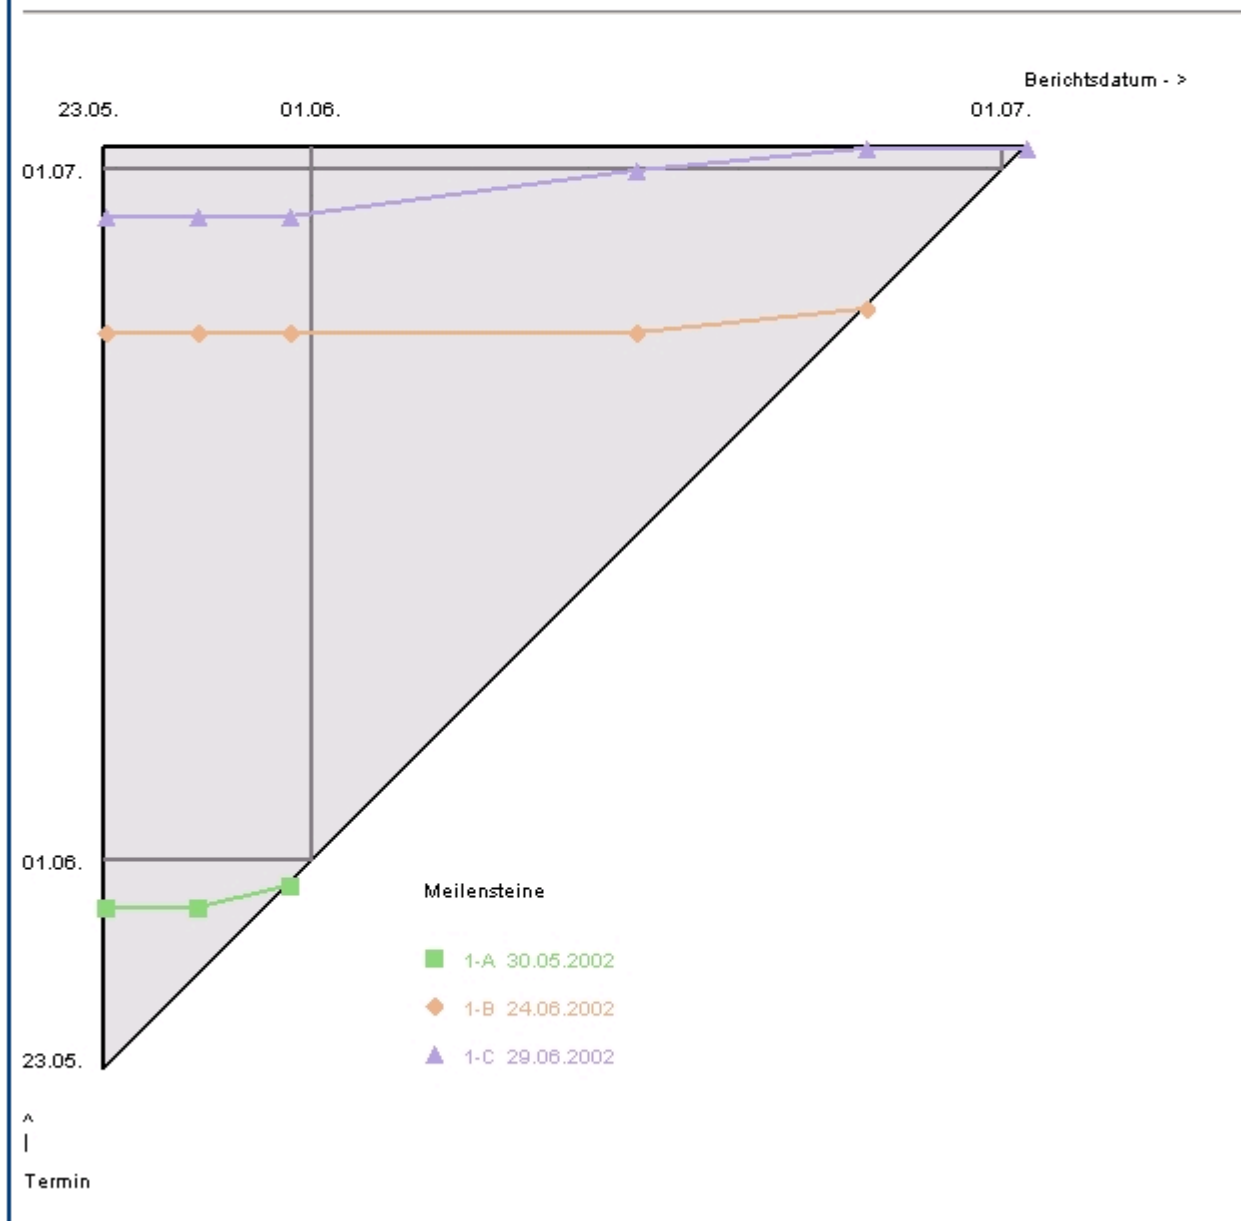

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.2.07\\_schaetzungen&rev=1248330145](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.2.07_schaetzungen&rev=1248330145)

Last update: **2019/10/25 14:09**

